


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-02 1015-04	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne do zapleczy budynków dwukrotnie malowane na budowie	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
3	KNR 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodelne o powierzchni do 2.0 m2 dwukrotnie malowane na budowie wzmocnione z dwoma zamkami	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
4	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200

Inspektor Nadzoru

Leszek Nagajowski
upr. bud. WRP


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		brama od strony ulicy			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	1.5*2.5	m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
2	KNR-W 2-	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne drewniane o tym samym kształcie z	m ²		
d.1	02 1026-03	naświetłem	m ²	3.750	
		1.5*2.5		RAZEM	3.750
3	KNR 2-02	Ościeżnice drewniane zewnętrzne z naświetłem szklanym dwukrotnie ma-	m		
d.1	1015-02	lowane i szklone na budowie	m	6.500	
		1.5*2*2.5		RAZEM	6.500
4	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-	m		
d.1	0708-02	wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m	13.000	
		2.5*4+1.5*2		RAZEM	13.000
5	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych 'Yale' analogia sa-	szt.		
d.1	0920-23	mozamykacza	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
6	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu zasuw czołowych	szt.		
d.1	0920-33	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu zasuw czołowych analogia blokada prętem	szt.		
d.1	0920-33	metalowym skrzydła drzwi	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
8	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
d.1	0920-20	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
d.1	0920-26	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10		dorobienie kluczy dla lokatorów	szt.		
d.1		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-	m ³		
d.1	0108-09	łość do 1 km	m ³	0.500	
		0.5		RAZEM	0.500
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ-	m ³		
d.1	0108-10	dy następny 1 km	m ³	0.500	
		0.5		RAZEM	0.500

Inspektor Nadzoru
[Podpis]
 mgr inż. Andrzej Paganowski
 ul. Włocławska 12 10-205 02

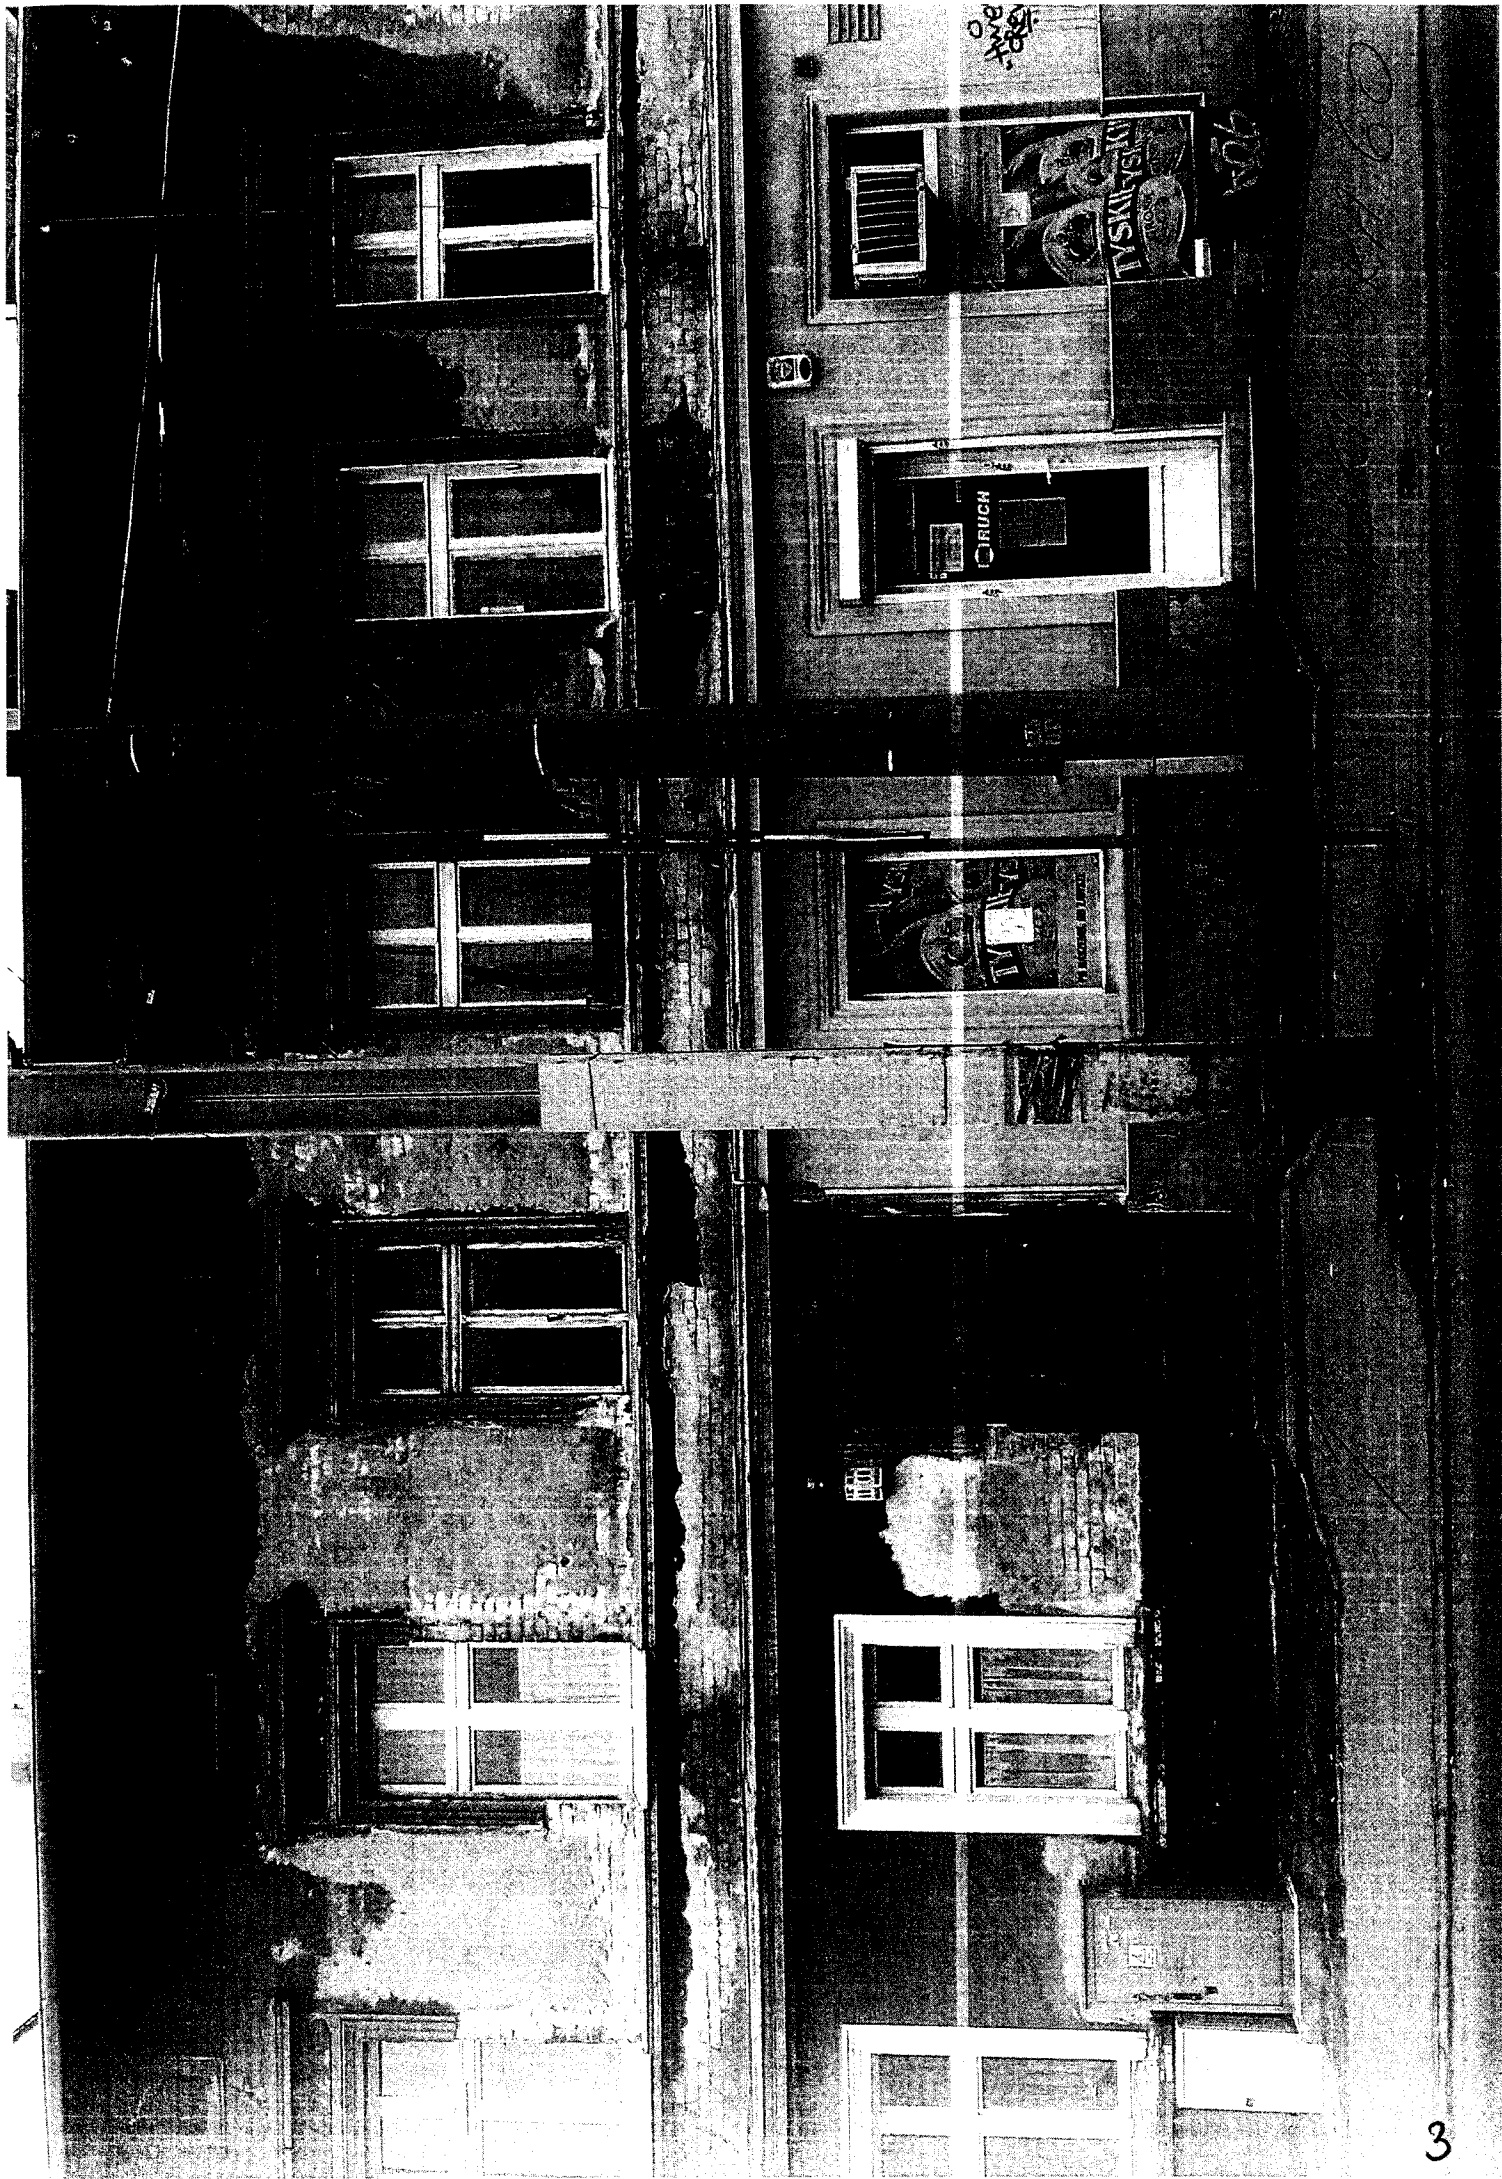


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-02 1015-04	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne do zapleczy budynków dwukrotnie malowane na budowie "90" drewniane wzmocnione 1.8	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2.05*4+1*2	m		
			m	10.200	
				RAZEM	10.200
5	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.2	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
7	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.2	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200

Inspektor Nadzoru

Leszek Siganowski


Szkic drzwi do mieszkania nr 2 przy ul. Nowodworskiej 52

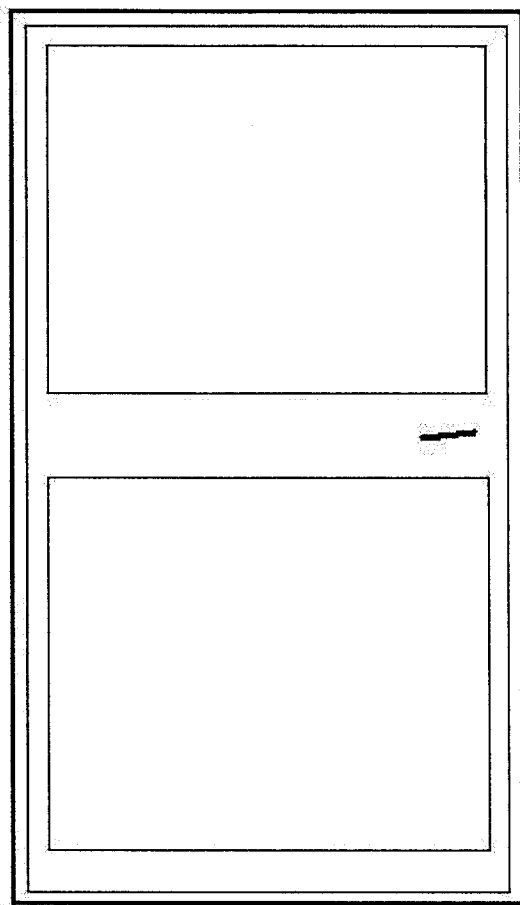


2,00

0,90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.1*2.1	m ² m ²	 2.310	
				RAZEM	2.310
2	KNR 2-02 1019-07	Skrzydła drzwiowe , z ościeżnicą , wzmacnione wejściowe do budynku wg. załączonego szkicu malowane lakierobejcą w kolorze brązowym 1.1*2.1	m ² m ²	 2.310	
				RAZEM	2.310
3	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane zewnętrzne z naswietlem szklanym dwukrotnie malowane i szklone na budowie 1.2+2.1*2	m m	 5.400	
				RAZEM	5.400
4	KNR 4-01 0318-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł 1.2*2.1	m ² m ²	 2.520	
				RAZEM	2.520
5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1.1*2+2.1*4	m m	 10.600	
				RAZEM	10.600
6	KNR 4-01 0920-23	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych 'Yale' amalgia samozamykacza 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0920-33	Założenie na nowym miejscu zasuw czołowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.4	m ³ m ³	 0.400	
				RAZEM	0.400

Inspektor Nadzoru
[Podpis]
 mgr. Bud. W. B. [imię]
 nr. 123/01205/02


Szkic drzwi od podwórza Stroma 31

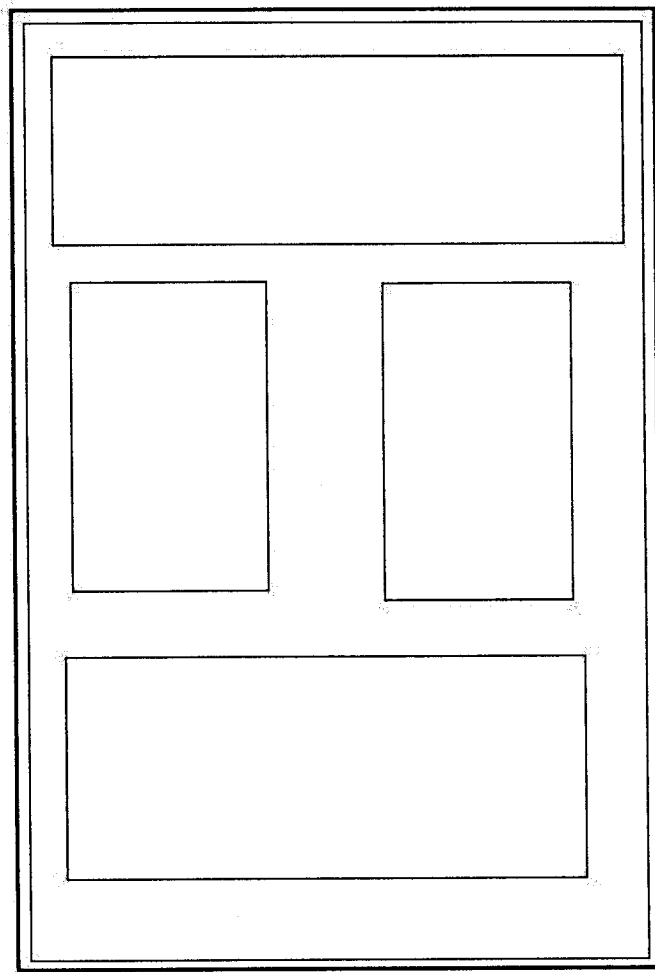

2,1

1A


Strome 31 od podlažja

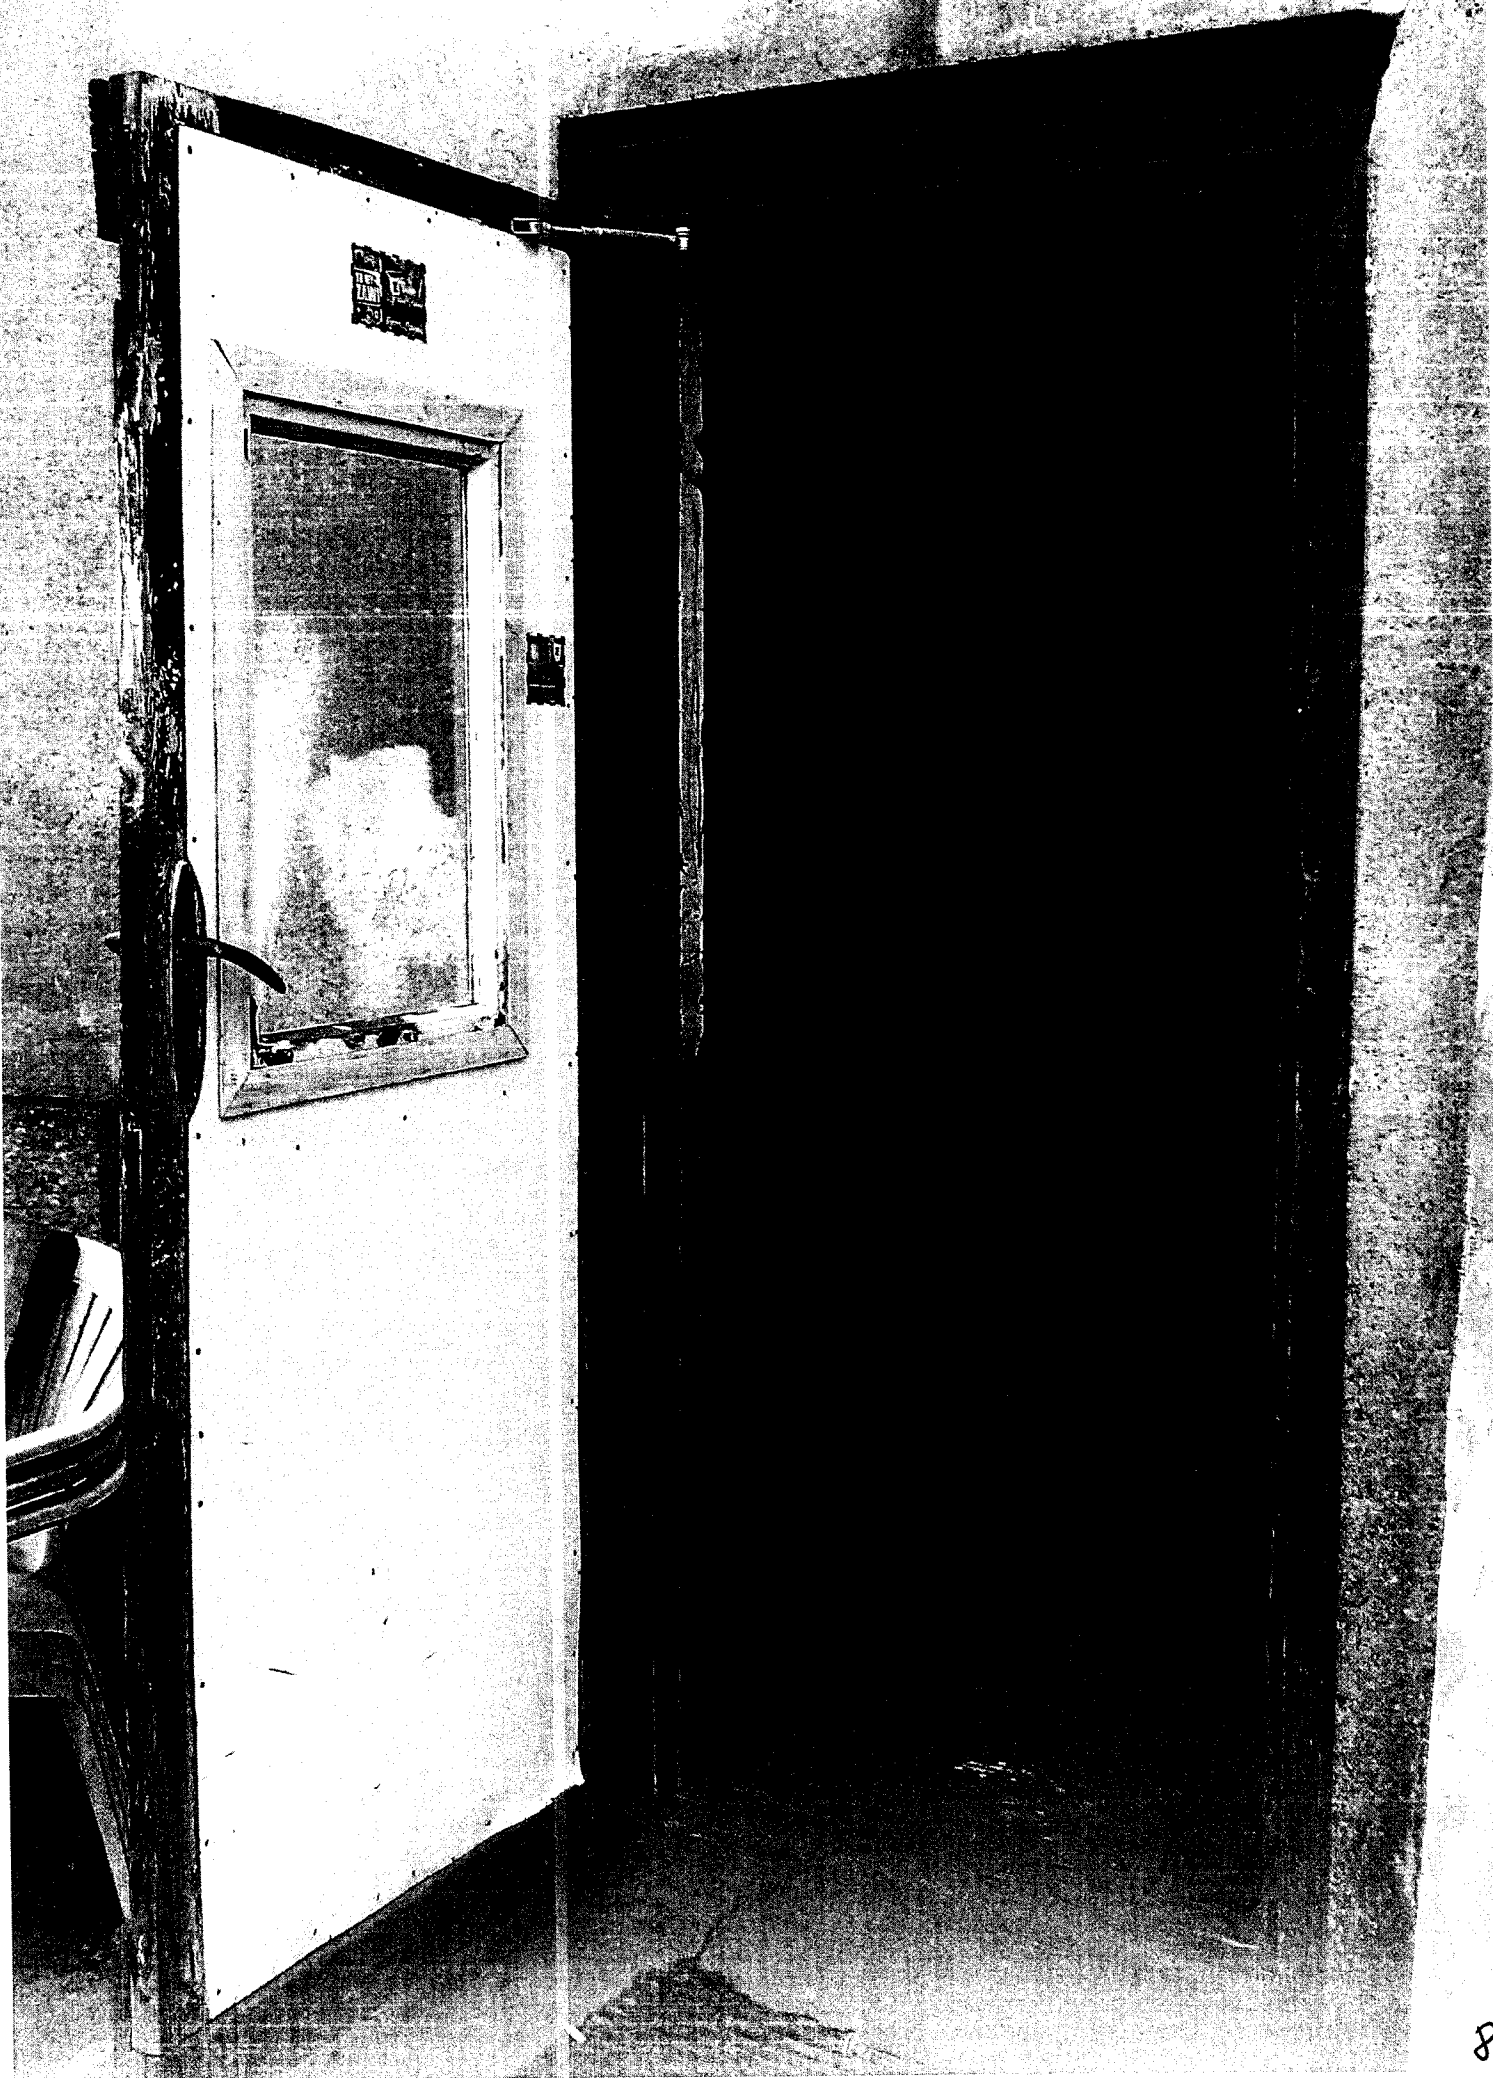

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.1*2.1	m ²		
			m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
2	KNR 2-02 1019-07	Skrzydła drzwiowe , z ościeżnicą , wzmocnione wejściowe do budynku wg. załączonego szkicu malowane lakierobejcą w kolorze brązowym 1.1*2.1	m ²		
			m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
3	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane zewnętrzne z naswietlem szklanym dwukrotnie malowane i szklone na budowie 1.2*2.1*2	m		
			m	5.400	
				RAZEM	5.400
4	KNR 4-01 0318-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł 1.2*2.1	m ²		
			m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1.3+2.25*2	m		
			m	5.800	
				RAZEM	5.800
6	KNR 4-01 0920-23	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych 'Yale' amalogia samozamykacza 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0920-33	Założenie na nowym miejscu zasuw czołowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.4	m ³		
			m ³	0.400	
				RAZEM	0.400

Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
 Nr. 7210/205/07

Skic drzwi od podwórza Ugory 43

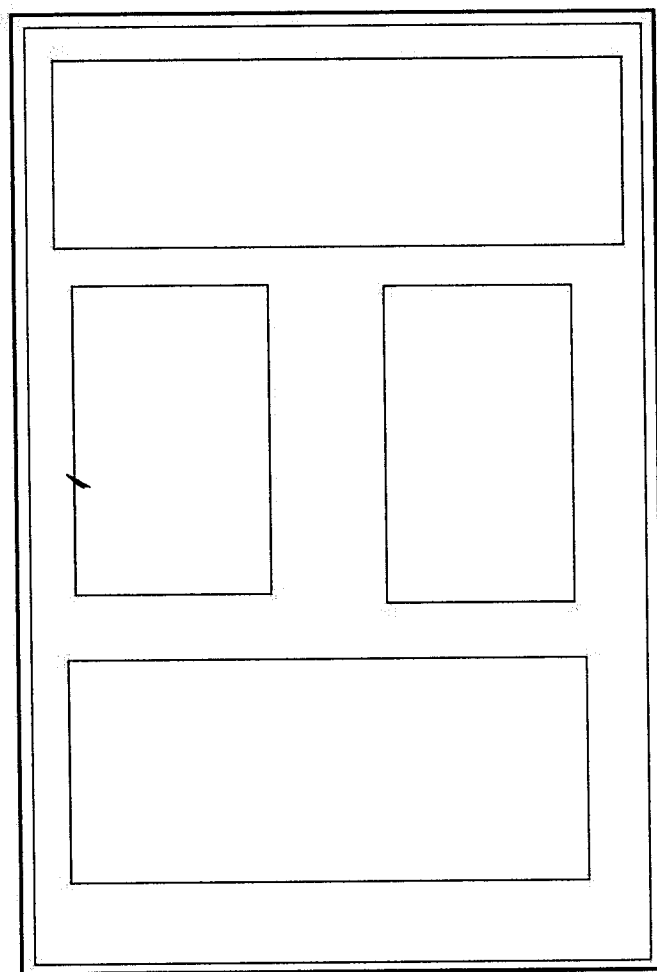

2,1

1A

U GORY 43 od podwoje t.

