
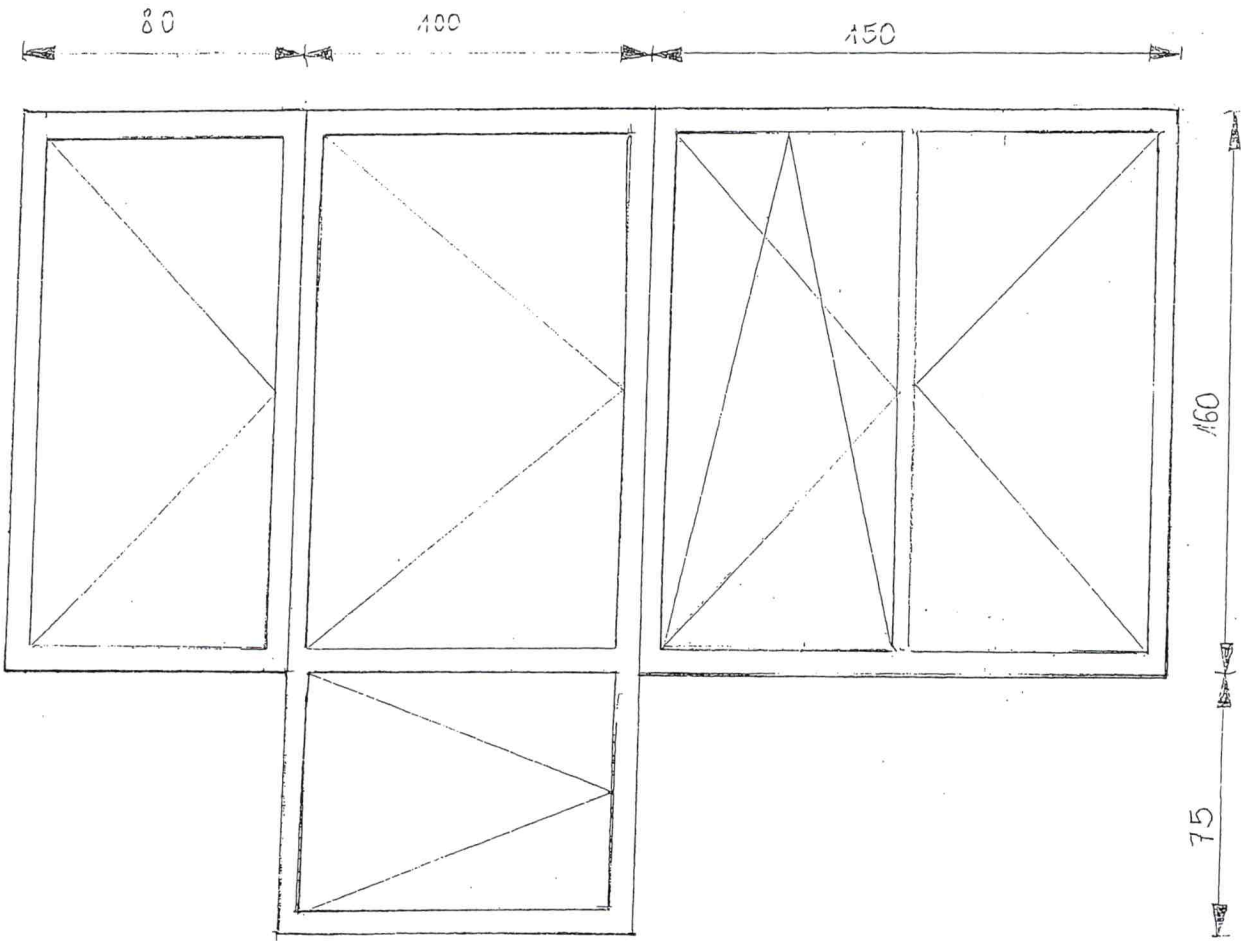


| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-------------------------|--|----------------------------------|---------|-------|
| 1 | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 d.1 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 0,8*1,6+1,6*1,5+1*2,35 | m ² m ² | 6,030 | |
| | | | | RAZEM | 6,030 |
| 2 | KNR 0-19 d.1 0930-06 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 6,030 | m ² m ² | 6,030 | |
| | | | | RAZEM | 6,030 |
| 3 | KNR 2-02 d.1 0506-02 | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 0,22*(0,8+1+1,5) | m ² m ² | 0,726 | |
| | | | | RAZEM | 0,726 |
| 4 | KNR 4-01 d.1 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,726 | m ² m ² | 0,726 | |
| | | | | RAZEM | 0,726 |
| 5 | KNR 4-01 d.1 0108-13 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość do 1 km 2,15 | m ³ m ³ | 2,150 | |
| | | | | RAZEM | 2,150 |
| 6 | KNR 4-01 d.1 0108-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 2,15 | m ³ m ³ | 2,150 | |
| | | | | RAZEM | 2,150 |

Inspektor Nadzoru Budowlanego


Małgorzata Tomaszewska
 upr. bud. UAN-KZ-72/0/375/86
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym



Saperów 44/1

Insp. Techniczny

fastorowski
fastorowski

