


| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|------------------------|--|----------------------------------|---------|-------|
| 1 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1,41*2,77 | m ² m ² | | |
| | | | | 3,906 | |
| | | | | RAZEM | 3,906 |
| 2 | KNR-W 2- 02 1026-02 | Ościeżnice drewniane dla drzwi z naswietlem szklonym górą 1,41*2,77 | m ² m ² | | |
| | | | | 3,906 | |
| | | | | RAZEM | 3,906 |
| 3 | KNR-W 2- 02 1027-03 | Drzwi zewnętrzne drewniane pełne dwuskrzydłowe z naswietlem o powierzchni ponad 1.5 m ² 2,08*1,41 | m ² m ² | | |
| | | | | 2,933 | |
| | | | | RAZEM | 2,933 |
| 4 | KNR 4-01 0705-01 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami (2,77+1,44+2,77)*2*0,20 | m m | | |
| | | | | 2,792 | |
| | | | | RAZEM | 2,792 |
| 5 | KNR 4-01 0920-20 | Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1 | szt. szt. | | |
| | | | | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 6 | KNR 4-01 0920-24 | Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1 | szt. szt. | | |
| | | | | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 7 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 2 2,792 | m ² m ² | | |
| | | | | 2,792 | |
| | | | | RAZEM | 2,792 |
| 8 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,2 | m ³ m ³ | | |
| | | | | 0,200 | |
| | | | | RAZEM | 0,200 |
| 9 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0,2 | m ³ m ³ | | |
| | | | | 0,200 | |
| | | | | RAZEM | 0,200 |

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kolas
upr. bud. UAN-KL/TA 0/120/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0904/01

Smoleńska 2

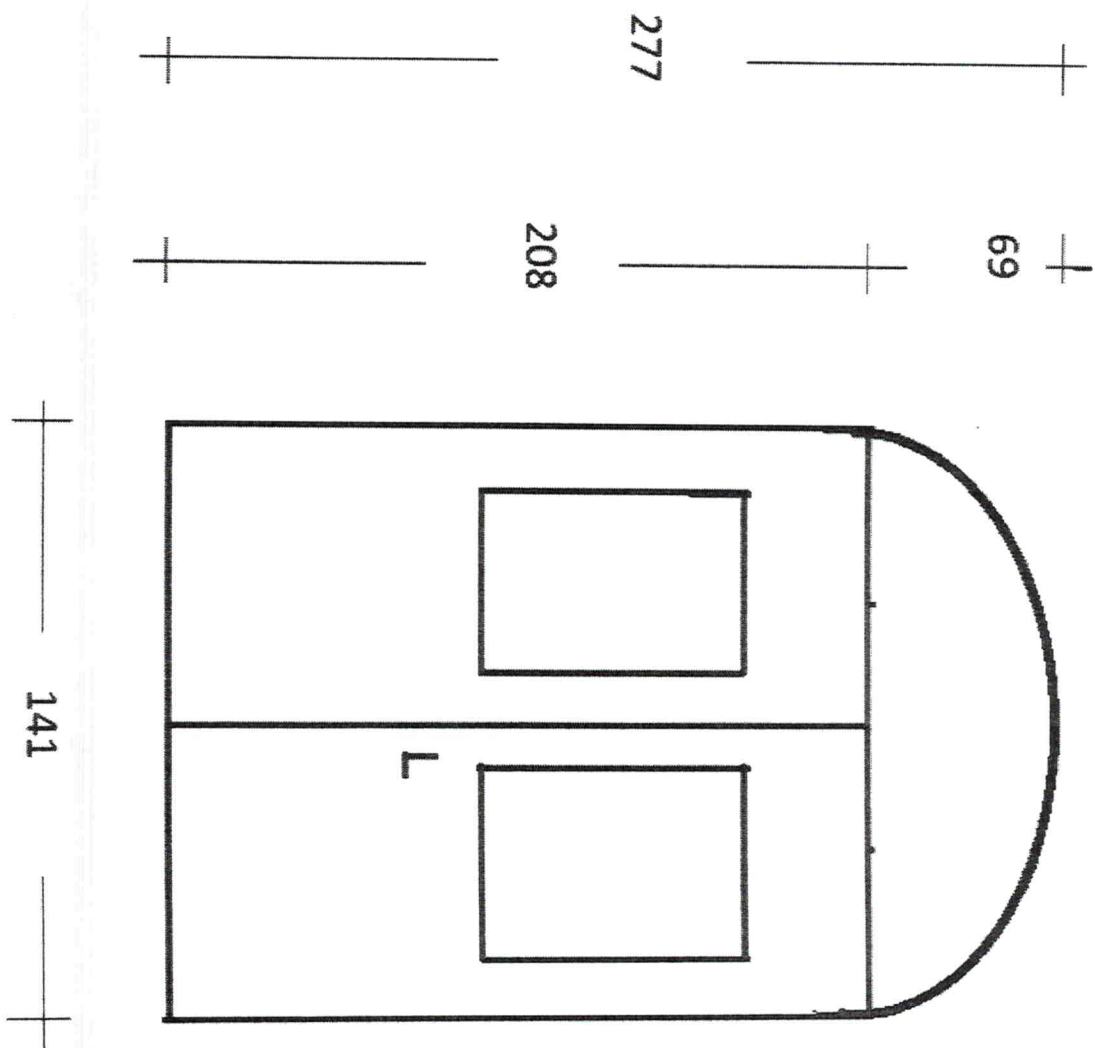


Inspektor Nadzoru/Inwestorskiego

Tadeusz Kalas
upr. bud. UAN-KP/101/20/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0904/01

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|------------------------------------|--|----------------|---------|-------|
| 1 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,85*1,0 | m ² | | |
| | | | m ² | 2,850 | |
| | | | | RAZEM | 2,850 |
| 2 | KNR-W 2- 02 1026-02 | Ościeżnice drewniane dla drzwi dwuskrzydłowych z naświetlem szklonym górną 2,85 | m ² | | |
| | | | m ² | 2,850 | |
| | | | | RAZEM | 2,850 |
| 3 | KNR-W 2- 02 1027-04 analogia | Drzwi zewnętrzne pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 2,25*1,0 | m ² | | |
| | | | m ² | 2,250 | |
| | | | | RAZEM | 2,250 |
| 4 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1,00*2+2,85*4)*0,25 | m ² | | |
| | | | m ² | 3,350 | |
| | | | | RAZEM | 3,350 |
| 5 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3,350 | m ² | | |
| | | | m ² | 3,350 | |
| | | | | RAZEM | 3,350 |
| 6 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 0,2 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 0,200 | |
| | | | | RAZEM | 0,200 |
| 7 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km 0,2 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 0,200 | |
| | | | | RAZEM | 0,200 |

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Tadeusz Kalas
 upr. bud. UAN-KZ/10/120/90
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/0904/01

Chorwacka 28

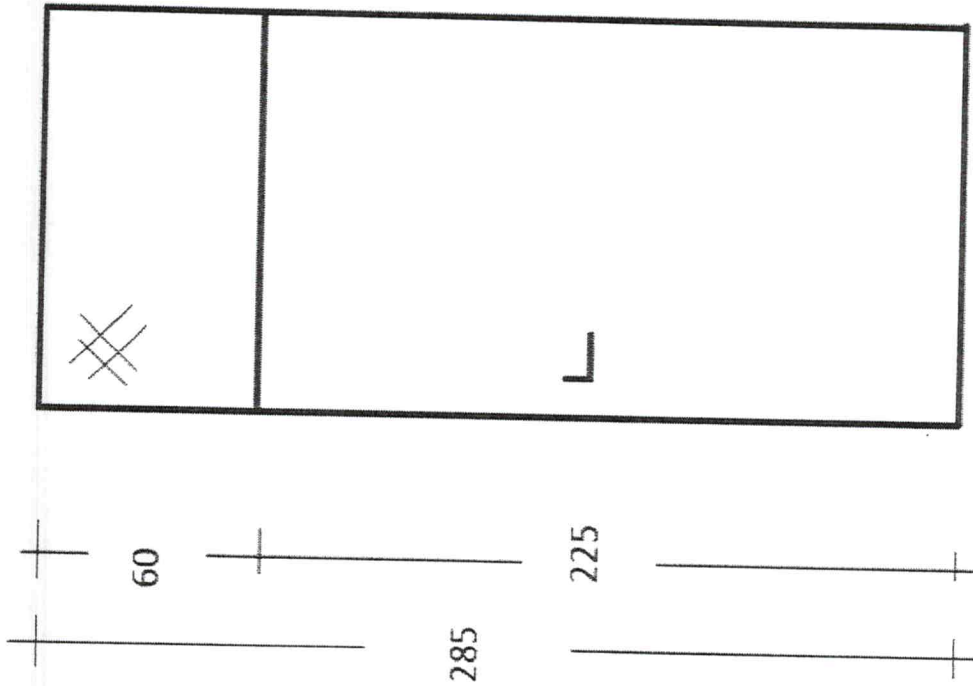

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Tadeusz Kulas
upr. bud. UAN-KZ/10/120/90
w specjalności konsultacyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0904/01

