


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1,45*1,13*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,916	
				RAZEM	4,916
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,45*3	m m	 4,350	
				RAZEM	4,350
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> 1,45*1,13*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,916	
				RAZEM	4,916
4	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 3	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
6	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1,45*3	m m	 4,350	
				RAZEM	4,350
7	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 3	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1,13*12+1,45*6)*0,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,565	
				RAZEM	5,565
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 5,565	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,565	
				RAZEM	5,565
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,200	
				RAZEM	0,200
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,200	
				RAZEM	0,200

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas  
upr. bud. UAM/IZ-7210/120/90  
w specjalności w zakresie inżynierii budowlanej  
w zakresie budowlanych  
KU/50/0504/01

Boh. Westerplatte 5/4

113

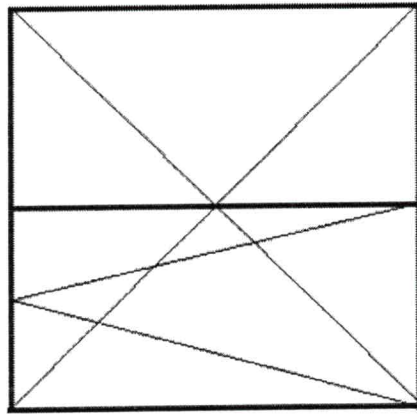

x 3

145


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
*Tudaus Kalas*  
upr. bud. DAN 7210/120/90  
w specjalności kwadrantowo-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym  
KUP/EO/0904/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,55*1,10*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,410	
				RAZEM	3,410
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,10*4	m		
			m	4,400	
				RAZEM	4,400
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1,55*1,10*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,410	
				RAZEM	3,410
4	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt		
			szt	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1,10*2	m		
			m	2,200	
				RAZEM	2,200
7	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 2	szt		
			szt	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1,55*8+1,10*4)*0,25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,200	
				RAZEM	4,200
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4,200	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,200	
				RAZEM	4,200
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,200	
				RAZEM	0,200
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0,2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,200	
				RAZEM	0,200

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Palas  
upr. bud. UAM-147-21-3/20/90  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym  
KUP/BO/0904/01

Glinki 147/21/3

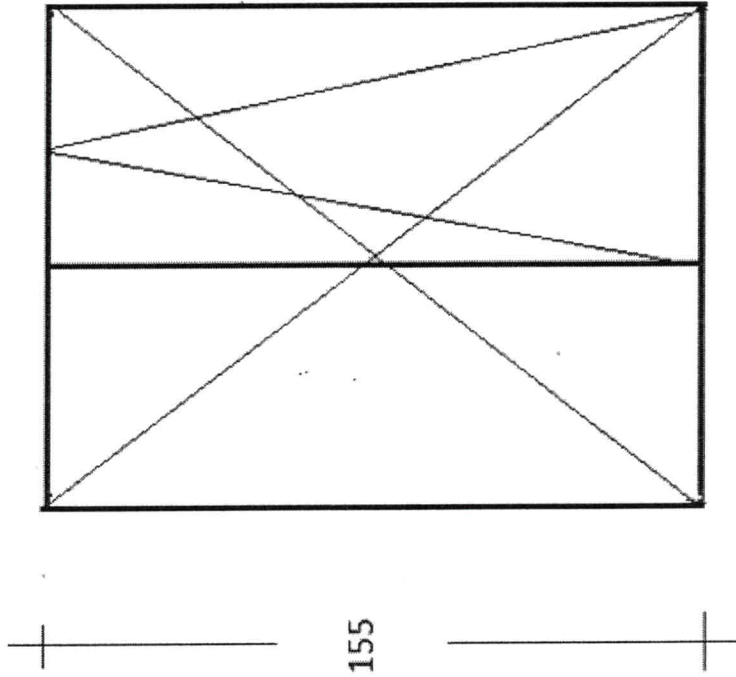



x 2

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
*Tadeusz Kulis*  
upr. bud. UM.W. 215/120/90  
w specjalności: Instalacje budowlanej  
w zakresie: ogólnobudowlany  
KUF/50/0904/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1,74*1,45+1,30*1,15*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,008	
				RAZEM	7,008
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,74+1,15*3	m m	5,190	
				RAZEM	5,190
3	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne itrójdzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> 1,74*1,45+1,15*1,30*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,008	
				RAZEM	7,008
4	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1,74+1,15*3	m m	5,190	
				RAZEM	5,190
7	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 3	szt szt	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1,74*2+1,45*4+1,15*6+1,30*12)*0,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,356	
				RAZEM	6,356
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 6,356	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,356	
				RAZEM	6,356
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,200	
				RAZEM	0,200
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,200	
				RAZEM	0,200

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
*Tadeusz Kalas*  
 upr. bud. UAN-10/120/90  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 w zakresie ogólnobudowlanym  
 KUP, 50/0904/01

Hutnicza 5/3

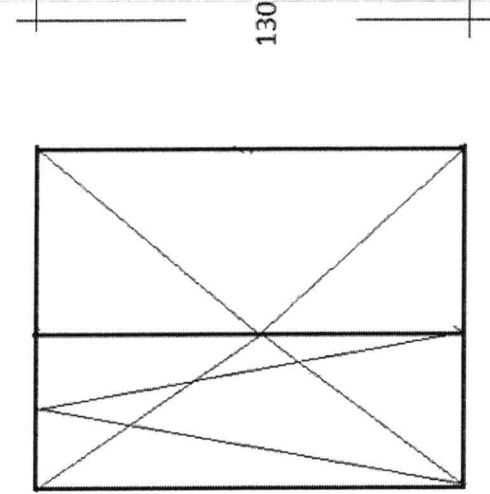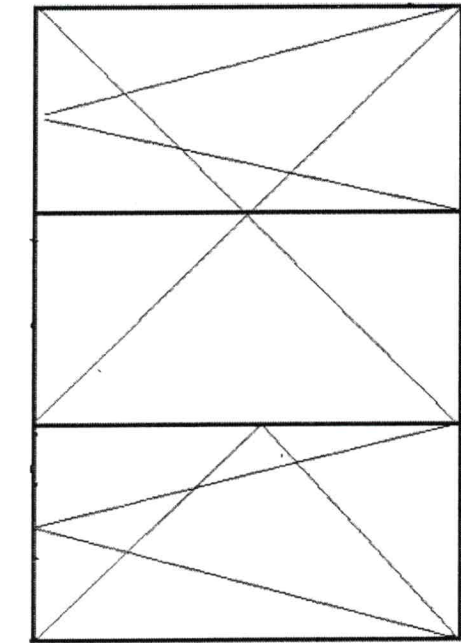

174

115

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
*Tadeusz Kolas*  
upr. bud. V ABN 7210/120/90  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym  
KUP/50/0904/01



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 2,08*1,09*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9,069	
				RAZEM	9,069
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,09*4	m		
			m	4,360	
				RAZEM	4,360
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> ze śłemeniem 2,08*1,09*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9,069	
				RAZEM	9,069
4	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 4	szt		
			szt	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1,09*4	m		
			m	4,360	
				RAZEM	4,360
7	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 4	szt		
			szt	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2,08*16+1,098)*0,20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,876	
				RAZEM	6,876
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 6,876	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,876	
				RAZEM	6,876
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,500	
				RAZEM	0,500
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0,5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,500	
				RAZEM	0,500


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Palas  
upr. bud. UAN 02/7210/120/90  
w specjalności kontroli inżyniero-budowlanej  
w zakresie budownictwa mieszkaniowego  
KUP/DO/0204/01


Karpacka 29/3



208

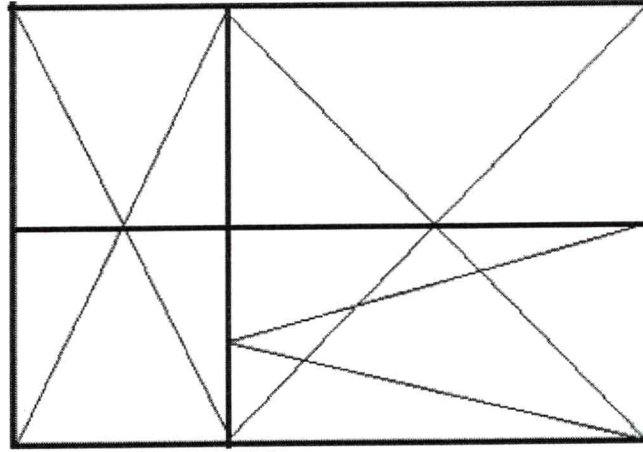

x4



109

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
*Tadeusz Żalas*  
upr. bud. U.M. K. 17210/120/90  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanych  
KUP/BO/0904/01




Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1,82*1,78	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,240	
				RAZEM	3,240
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,82*2	m		
			m	3,640	
				RAZEM	3,640
3	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trój- dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> ze ślaniem 1,82*1,78	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,240	
				RAZEM	3,240
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1,82	m		
			m	1,820	
				RAZEM	1,820
6	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1,82*2+1,78*4)*0,20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,152	
				RAZEM	2,152
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,152	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,152	
				RAZEM	2,152
9	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 0,2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,200	
				RAZEM	0,200
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km - 20 km 0,2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,200	
				RAZEM	0,200

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kolas  
upr. bud. Wzrost 7219 12090  
w specjalności: budowlano-bud. w kanaj  
w latach 1998-2014  
KUP, 50.000-901

Karpacka 45/2

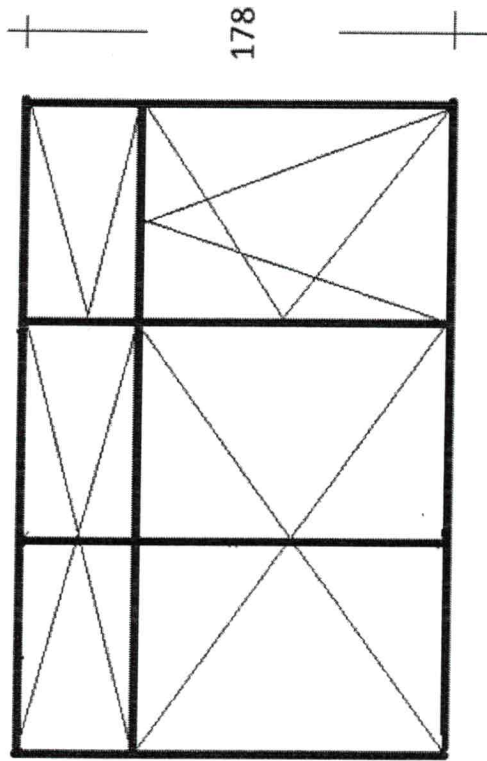

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego


Tadeusz Malas

upr. bud. U/A/N-K/10/120/90  
w specjalności kosztowo-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym  
KUF/80/0994/01


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1,78*1,60+0,68*1,60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,936	
				RAZEM	3,936
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,78+0,68	m		
			m	2,460	
				RAZEM	2,460
3	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne i trójdzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> ze ślaniem 1,78*1,60+1,60*0,68	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,936	
				RAZEM	3,936
4	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt		
			szt	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1,78+0,68	m		
			m	2,460	
				RAZEM	2,460
7	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 2	szt		
			szt	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1,78*4+0,68*4+1,60*8)*0,20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,528	
				RAZEM	4,528
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4,528	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,528	
				RAZEM	4,528
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,200	
				RAZEM	0,200
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0,2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,200	
				RAZEM	0,200

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
*Tadeusz Palas*  
 upr. bud. UAB-10/120/90  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 w zakresie ogólnobudowlanym  
 KUP/BO/0304/01

Karpacka 45/4

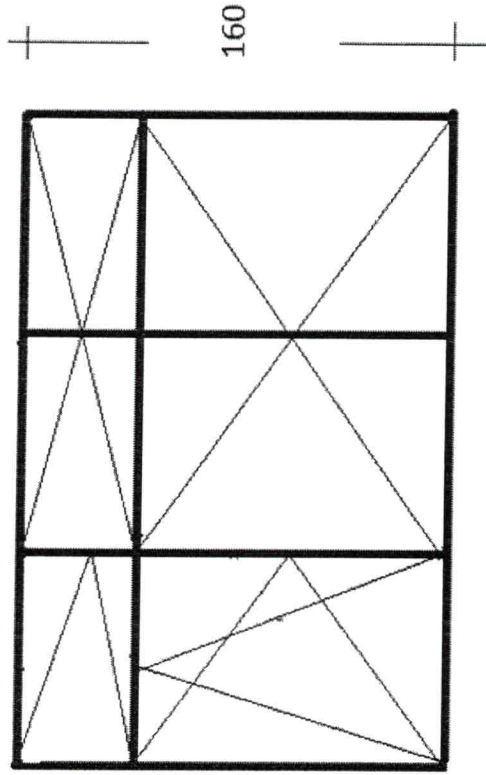

— 178 —

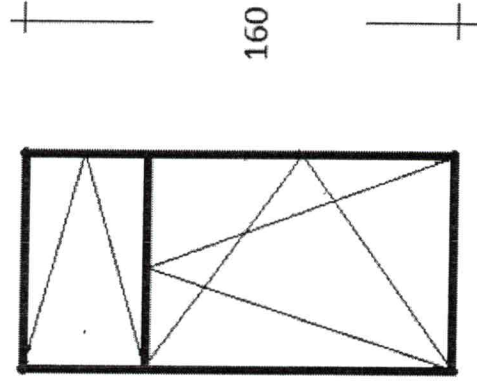

— 68 —

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
*Tadeusz Golas*  
upr. bud. UAN-57-210/120/90  
w specjalności: Kierownik budowlanej  
w zakresie obrotu i dowalnym  
KUP/50/0904/01


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,72*1,52*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10,458	
				RAZEM	10,458
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,52*4	m		
			m	6,080	
				RAZEM	6,080
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1,72*1,52*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10,458	
				RAZEM	10,458
4	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 4	szt		
			szt	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1,52*4	m		
			m	6,080	
				RAZEM	6,080
7	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 4	szt		
			szt	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1,52*8+1,72*16)*0,25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9,920	
				RAZEM	9,920
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 9,920	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9,920	
				RAZEM	9,920
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,200	
				RAZEM	0,200
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0,2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,200	
				RAZEM	0,200

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kolas  
 upr. bud. UAN 50/7210/120/90  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 w zakresie objętości budowlanych  
 KUP/50/0904/01

lukasiewicz 8/42

172

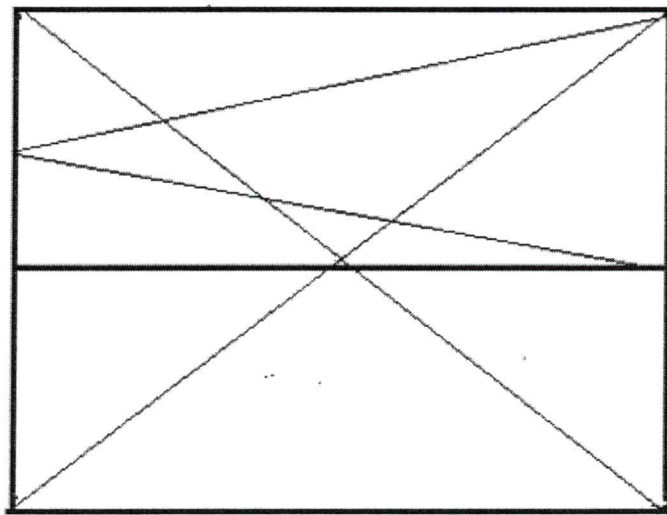

x 4

152

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
*Tadeusz Kalas*  
upr. bud. UAN/007210/120/90  
w specjalności konstr. wyim.-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym  
KUP/EO/0904/01




Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,50*1,50+1,70*1,50*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8,850	
				RAZEM	8,850
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,50*3	m		
			m	4,500	
				RAZEM	4,500
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1,70*1,50*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5,100	
				RAZEM	5,100
4	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV 2,50*1,50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,750	
				RAZEM	3,750
5	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 3	szt		
			szt	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1,50*3	m		
			m	4,500	
				RAZEM	4,500
8	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 3	szt		
			szt	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2,50*4+1,50*10+1,70*8)*0,25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9,650	
				RAZEM	9,650
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 9,650	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9,650	
				RAZEM	9,650
11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,200	
				RAZEM	0,200
12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0,2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,200	
				RAZEM	0,200

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas  
 upr. bud. 044/KP/210/120/90  
 w specjalności Inżynieria Budowlanej  
 w zakresie ogólnobudowlanym  
 KUP. BO.0904/01

Lukasiewiczza 8/46

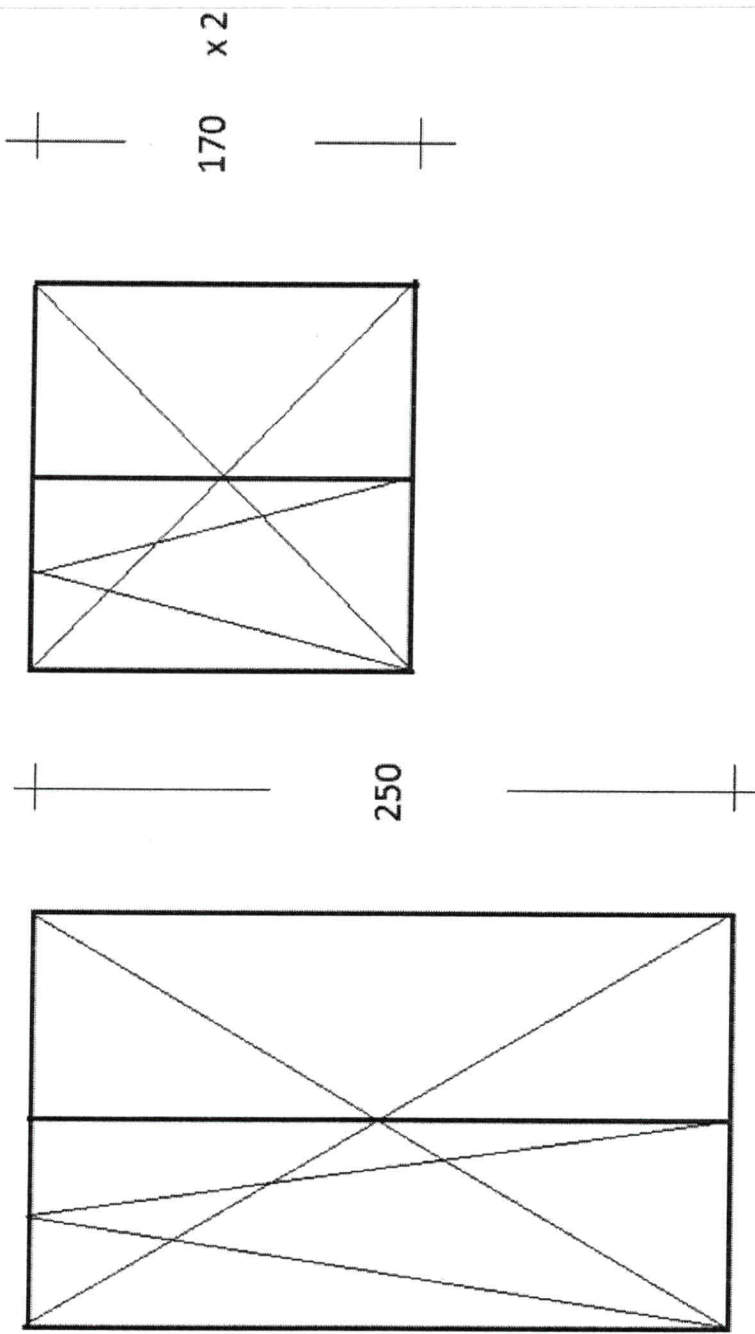

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
*Tomasz Kulas*  
upr. bud. AM/7210/120/90  
w specjalności wykończenia-budowlanej  
w zakresie obiektów budowlanych  
KUF/BO/70504/G1





Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,30*0,90+0,85*1,15*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,025	
				RAZEM	4,025
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 0,90+0,85*2	m		
			m	2,600	
				RAZEM	2,600
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 0,85*1,15*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,955	
				RAZEM	1,955
4	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV 2,30*0,90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,070	
				RAZEM	2,070
5	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt		
			szt	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 0,85*2+0,90	m		
			m	2,600	
				RAZEM	2,600
8	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 2	szt		
			szt	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2,30*2+0,90*2+1,15*8+0,85*8)*0,25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5,600	
				RAZEM	5,600
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 5,600	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5,600	
				RAZEM	5,600
11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,200	
				RAZEM	0,200
12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0,2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,200	
				RAZEM	0,200

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
 Tadeusz Kulas  
 upr. bud. UAM-K/10/120/90  
 w specjalności: kontrola budowlanej  
 w zakresie ogólnobudowlanym  
 KUP.00.0904/01

Spółdzielcza 4/18

115

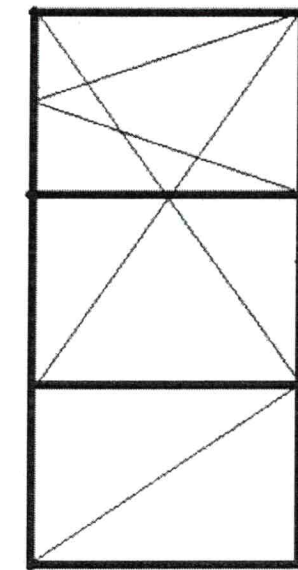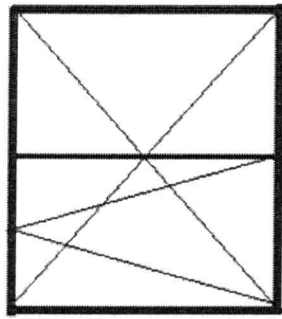

230

230

90 85 85

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
*Tadeusz Kalas*  
upr. bud. UAN-M w 210/120/90  
w specjalności kier. i nadz. inżyn.-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym  
KUP/BO/0504/01




Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,65*1,50+1,50*1,50+1,75*1,50+1,15*1,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,518	
				RAZEM	10,518
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 2,65+1,50+1,75+1,45	m m	7,350	
				RAZEM	7,350
3	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne i trójdzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 1,50*2,65+1,50*1,50+1,75*1,50+1,15*1,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,518	
				RAZEM	10,518
4	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 4	szt szt	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 2,65+1,50+1,75+1,45	m m	7,350	
				RAZEM	7,350
7	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 4	szt szt	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2,65*2+1,75*2+1,45*2+1,15*2+1,50*14)*0,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,000	
				RAZEM	7,000
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 7,000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,000	
				RAZEM	7,000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,200	
				RAZEM	0,200
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,200	
				RAZEM	0,200

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas  
upr. bud. UKA 4-7/0210/120/90  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie obrotu budowlanym  
KUP, 50/0904/01



Walecznych 4/2

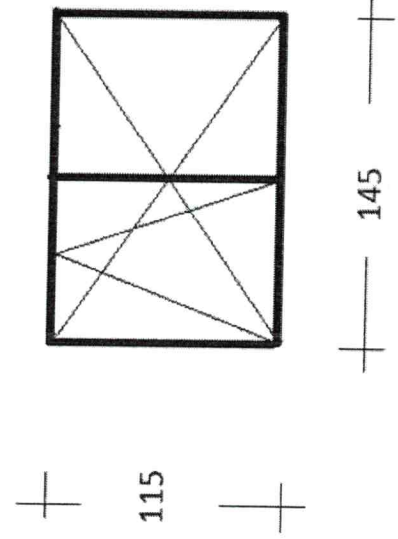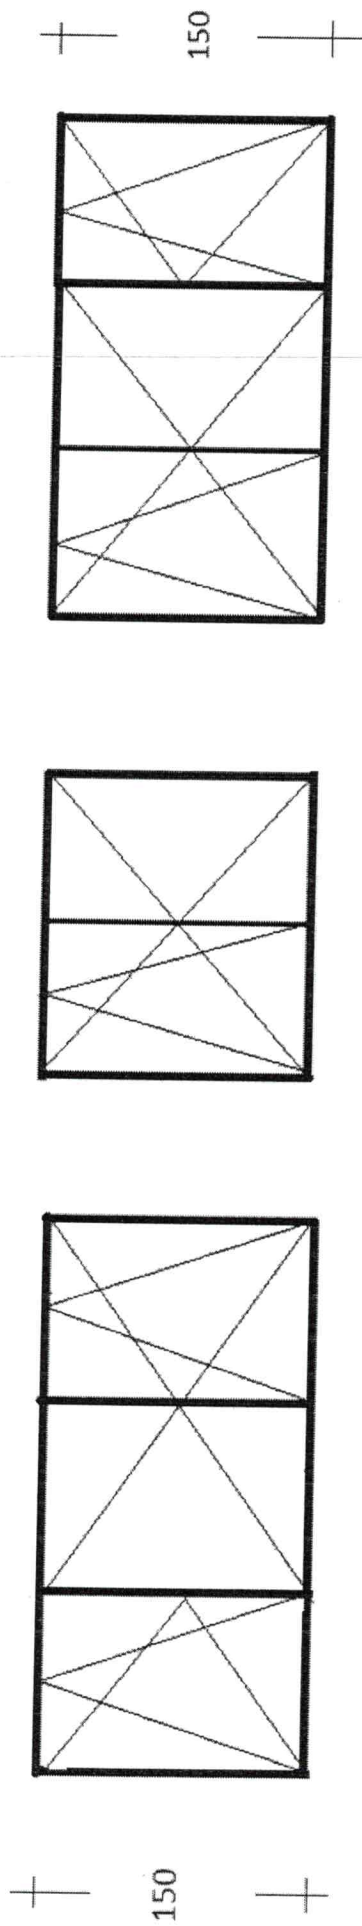

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
*Tadavus Kaldas*  
upr. bud. UIN/17210/120/90  
w specjalności krytych i niekrytych budynków budowlanej  
w zakresie obiektów budowlanych  
KUP/30/0904/01



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,0*2,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,200	
				RAZEM	2,200
2	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o powierzchni ponad 1.0 m2 1,98*0,97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,921	
				RAZEM	1,921
4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami (2,2+2,20+1,0)*2	m m	10,800	
				RAZEM	10,800
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 9,86*0,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,972	
				RAZEM	1,972
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,200	
				RAZEM	0,200
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,200	
				RAZEM	0,200

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas  
upr. bud. UAN-17210/120/90  
w specjalności Kwalifikacyjno-budowlanej  
w zakresie czynności powiązanych  
KUP, BO/0804/01
