


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.60*1.50*2	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.50*2	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1.60*1.50*2	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.50*2	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
6	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1.60*8+1.50*4)*0.15	m ²		
			m ²	2.820	
				RAZEM	2.820
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2.820	m ²		
			m ²	2.820	
				RAZEM	2.820
9	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.2	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.2	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kukuś
Upł. Rnd. LAN/27210/120/90

1

Szarych Szeregów 11/56

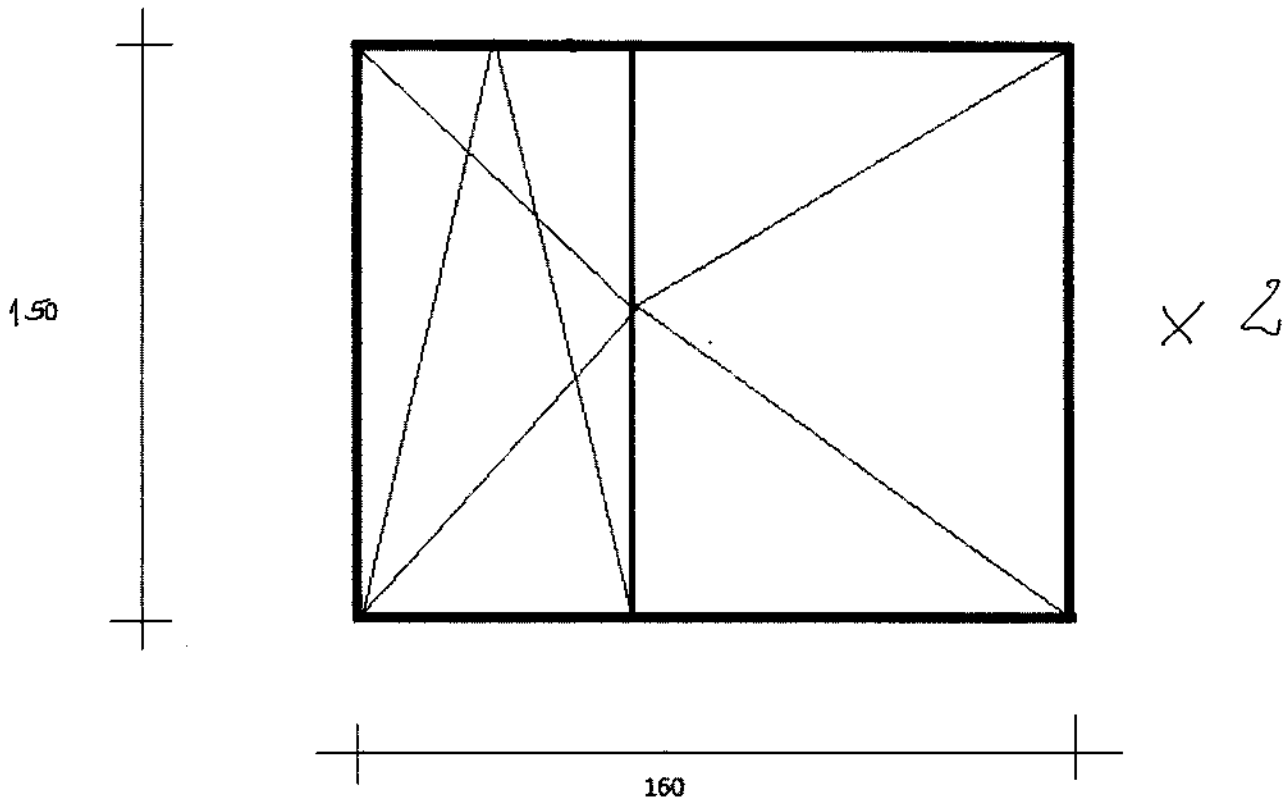

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. JAK-RZ-210/120/90


Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.60*1.50	m ² m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.50	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² 1.60*1.50	m ² m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powiekanej 1.50	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
6	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1.60*4+1.50*2)*0.15	m ² m ²	1.410	
				RAZEM	1.410
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.410	m ² m ²	1.410	
				RAZEM	1.410
9	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200

inspektor Nadzoru

Tadeusz Galas
Nr. Bud. JANK 10/120/90

3

BIAKOGARDZKA 16/42

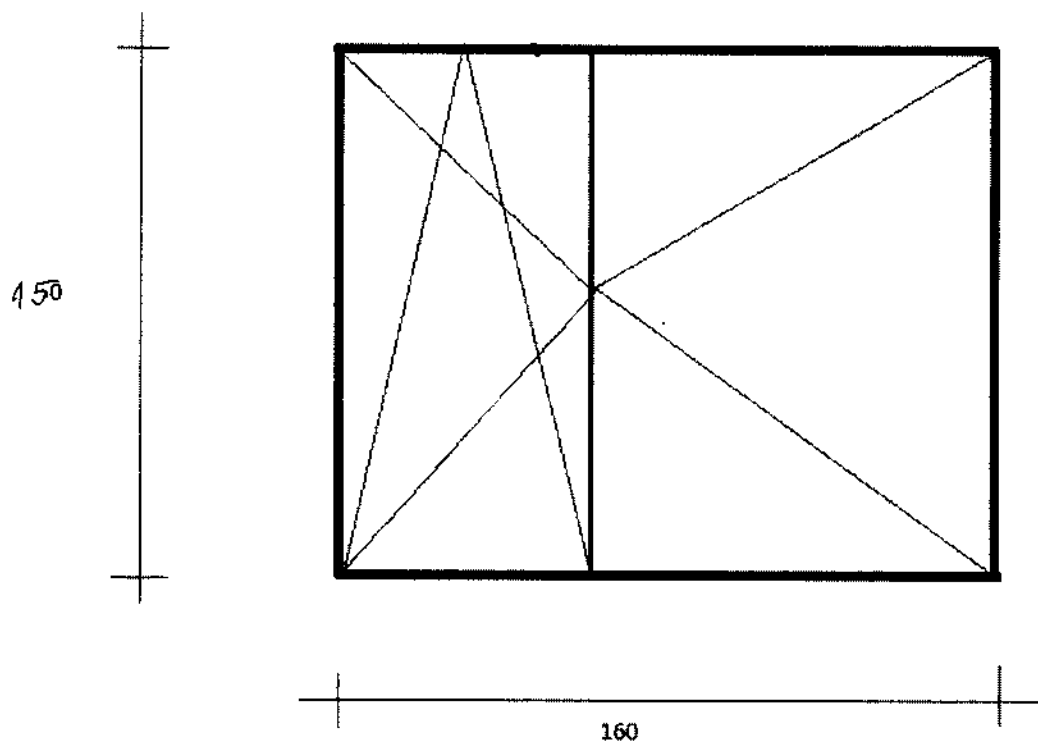



inspektor Nadzoru
Tadeusz Kulis
Upr. Bud. W.N. 16/42/20190

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.60*1.60*2+0.80*1.70	m ² m ²	6.480	
				RAZEM	6.480
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.60*2+0.8	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 0-19 0929-11 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trój- dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 1.60*1.60*2+0.80*1.70	m ² m ²	6.480	
				RAZEM	6.480
4	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powiekanej 1.60*2+0.80	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
7	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1.60*12+1.70*8+0.80*4)*0.15	m ² m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 5.400	m ² m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km - 20 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Inspektor Nadzoru
Tadeusz Kulas
Upr. Bud. Upr. 12722/01/2010

5

Noakowskiego 4/48

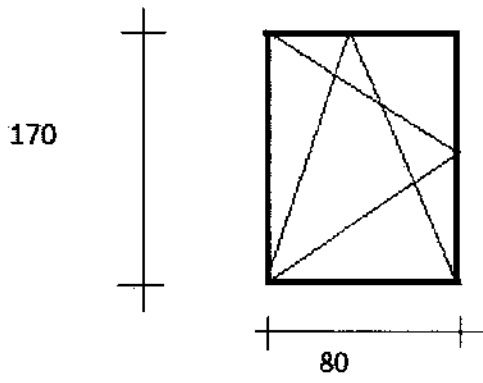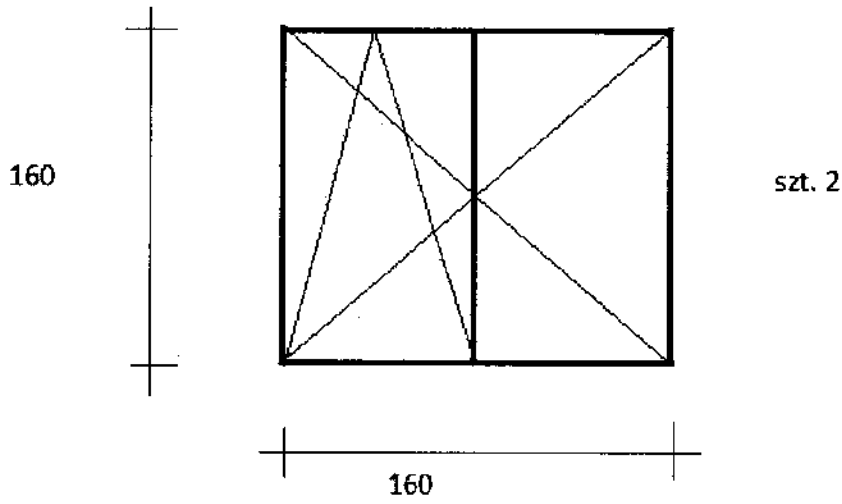

Inspektor Nadzoru

Tadeusz Kelas
Upr. Bud. UAN. KE. 72.10/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.50*2.2	m ² m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
2	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane na budowie o powierzchni ponad 1.0 m2 2.02*1.00	m ² m ²	2.020	
				RAZEM	2.020
4	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 0.5*2.20	m ³ m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
5	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 0.5*2.2*2	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
6	KNR-W 2- 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (2.2+2.20+1.0)*2+2.20	m ² m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
7	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 13.0	m ² m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200

Inspektor Nadzoru

Tadeusz Kujas
Upr. Bud. UAN-KZ-720/12090

7
