


Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana stolarki okiennej			
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.05*1.85	m ²		
			m ²	1.943	
2	KNR 2-02 d.1 1001-08 analogia	Okno jednodzielne, dwurzędowe drewniane zespolone wzmocnione budownictwa mieszkaniowego z drewna klejonego warstwowo (rozwieralno uchylne) w kolorze białym, zachowujące wielkości, podziały i profile stolarki istniejącej (1 szt.) 1.3*1.85	m ²	RAZEM	1.943
			m ²	2.405	
3	kalkulacja d.1 własna	Montaż nawiewników higrosterowanych 1	szt	RAZEM	2.405
			szt	1.000	
4	KNR 2-02 d.1 0506-02 analogia	Obróbki przy szer.w rozv.ponad 25cm - parapety zewnętrzne z blachy polwlekanej 1.2*0.35	m ²	RAZEM	1.000
			m ²	0.420	
5	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.1	m	RAZEM	0.420
			m	1.100	
6	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł parapet wewnętrzny z drewna litego 1	szt.	RAZEM	1.100
			szt.	1.000	
7	KNR 4-01 d.1 0708-02 analogia	Wykon.tynków zwykłych wewn. i zewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm 2*(1.85*2+1.05)*0.25	m	RAZEM	1.000
			m	2.375	
8	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży w kolorze białym 2.35	m ²	RAZEM	2.375
			m ²	2.350	
9	KNR 4-01 d.1 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.1	m ³	RAZEM	2.350
			m ³	0.100	
10	KNR 4-01 d.1 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 0.1	m ³	RAZEM	0.100
			m ³	0.100	
				RAZEM	0.100


Inspektor Nadzoru

Wojciech Cholewicki
Nr ug. bud. CP-KZ-73427/193


Koronowska 3A/3- 1 sztuka

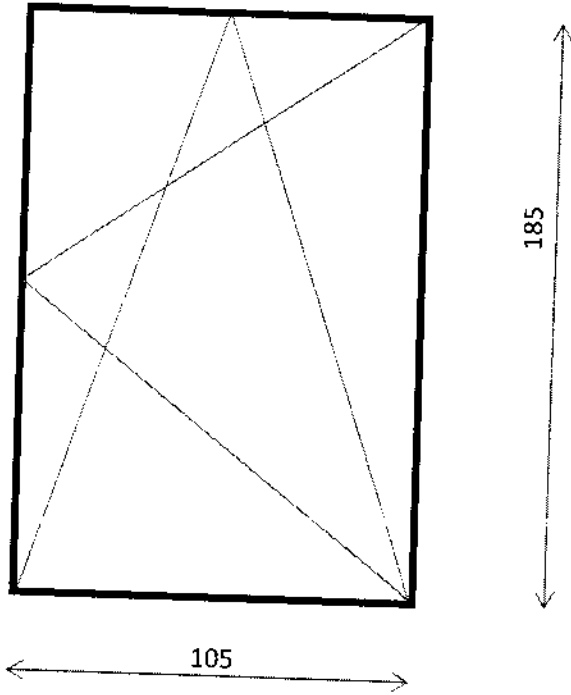

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana stolarki okiennej			
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.3*1.7	m ²		
			m ²	2.210	
2	KNR 2-02 d.1 1001-08 analogia	Okno dwudzielne, dwurzędowe drewniane zespolone wzmocnione budowlnictwa mieszkaniowego z drewna klejonego warstwowo (rozwieralno uchylnie) w kolorze białym, zachowujące wielkości, podziały i profile stolarki istniejącej (1 szt.) 1.3*1.7	m ²	RAZEM	2.210
			m ²	2.210	
3	kalkulacja d.1 własna	Montaż nawiewników higrosterowanych 1	szt	RAZEM	2.210
			szt	1.000	
4	KNR 2-02 d.1 0506-02 analogia	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - parapety zewnętrzne z blachy powlekanej 1.4*0.35	m ²	RAZEM	1.000
			m ²	0.490	
5	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.4	m	RAZEM	0.490
			m	1.400	
6	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł parapet wewnętrzny z drewna litego 1	szt.	RAZEM	1.400
			szt.	1.000	
7	KNR 4-01 d.1 0708-02 analogia	Wykon.tynków zwykłych wewn. i zewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm 2*(1.7*2+1.3)*0.25	m	RAZEM	1.000
			m	2.350	
8	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży w kolorze białym 2.35	m ²	RAZEM	2.350
			m ²	2.350	
9	KNR 4-01 d.1 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.1	m ³	RAZEM	2.350
			m ³	0.100	
10	KNR 4-01 d.1 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 0.1	m ³	RAZEM	0.100
			m ³	0.100	
				RAZEM	0.100

Inspektor Nadzoru

 Wojciech Chojewski
 Nr upr. bud. GP-KZ-7342/77/93

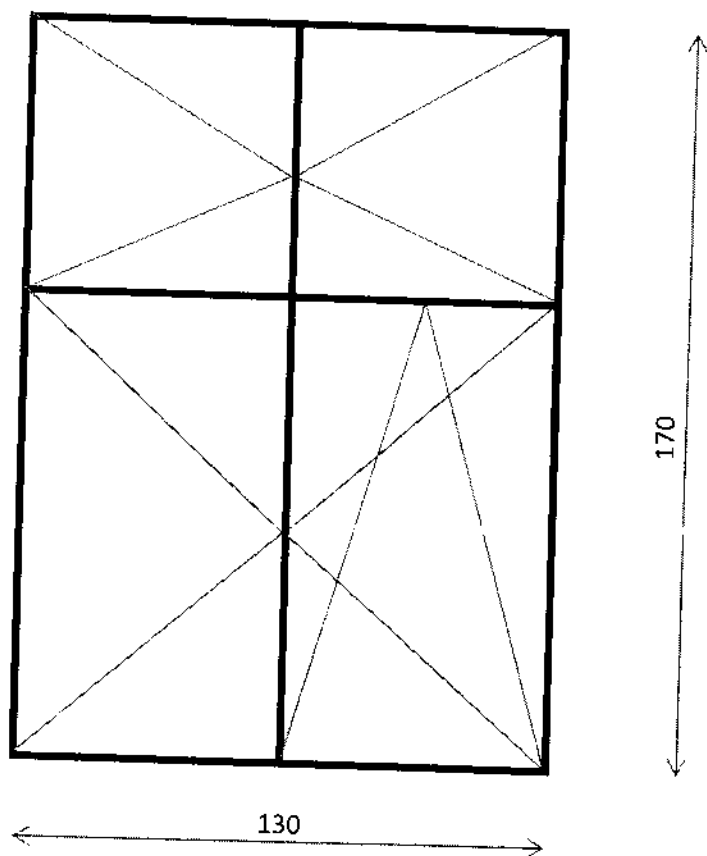Żeglarska 69/11- 1 sztuka




Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana stolarki okiennej			
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 0.87*0.97+1*0.92	m ²		
			m ²	1.764	
				RAZEM	1.764
2	KNR 2-02 d.1 1001-08 analogia	Okna jednodzielne drewniane zespolone wzmacnione budownictwa mieszkaniowego z drewna klejonego warstwowo (rozwieralno uchylne) w kolorze białym , zachowujące wielkości, podziały i profile stolarki istniejącej (2 szt.) 0.87*0.97+1*0.92	m ²		
			m ²	1.764	
				RAZEM	1.764
3	kalkulacja d.1 własna	Montaż nawiewników higrosterowanych 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 2-02 d.1 0506-02 analogia	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - parapety zewnętrzne z blachy powlekanej 1.1*0.35*2	m ²		
			m ²	0.770	
				RAZEM	0.770
5	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 2.2	m		
			m	2.200	
				RAZEM	2.200
6	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegiel parapet wewnętrzny z drewna litego 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 d.1 0708-02 analogia	Wykon.tynków zwykłych wewn. i zewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm 4*0.97*0.25+2*0.25	m		
			m	1.470	
				RAZEM	1.470
8	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży w kolorze białym 1.47	m ²		
			m ²	1.470	
				RAZEM	1.470
9	KNR 4-01 d.1 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.1	m ³		
			m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
10	KNR 4-01 d.1 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 0.1	m ³		
			m ³	0.100	
				RAZEM	0.100

Inspektor Nadzoru
 Wojciech Chłopański
 Nr upraw. GP-KZ-7342/77/93

5


Grunwaldzka 176/9- 1 sztuka

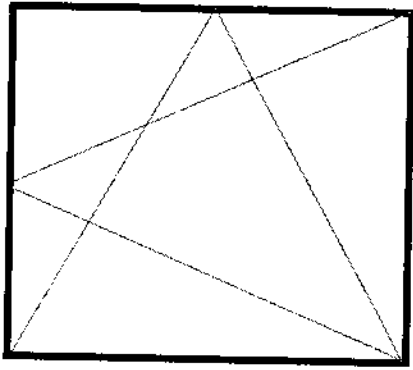

97

87

Grunwaldzka 176/9- 1 sztuka

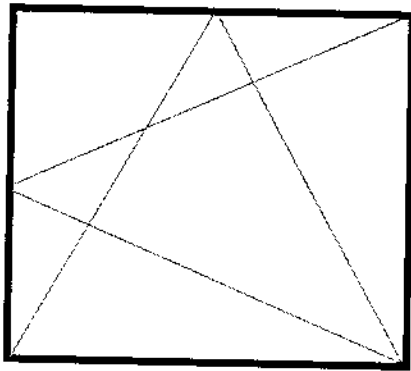

92


100

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana stolarki okiennej			
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.1*1.98	m ² m ²	2.178	
				RAZEM	2.178
2	KNR 2-02 d.1 1001-08 analogia	Okno dwudzielne, dwurzędowe drewniane zespolone wzmacnione budownictwa mieszkaniowego z drewna klejonego warstwowo (rozwieralno uchylne) w kolorze białym , zachowujące wielkości, podziały i profile stolarki istniejącej (1 szt.) 1.1*1.98	m ² m ²	2.178	
				RAZEM	2.178
3	kalkulacja d.1 własna	Montaż nawiewników higrosterowanych 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-02 d.1 0506-02 analogia	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - parapety zewnętrzne z blachy powlekanej 1.2*0.35	m ² m ²	0.420	
				RAZEM	0.420
5	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.1	m m	1.100	
				RAZEM	1.100
6	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegiel parapet wewnętrzny z drewna litego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 d.1 0708-02 analogia	Wykon tynków zwykłych wewn. i zewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm 2*(1.98*2+1.1)*0.25	m m	2.530	
				RAZEM	2.530
8	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży w kolorze białym 2.53	m ² m ²	2.530	
				RAZEM	2.530
9	KNR 4-01 d.1 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.1	m ³ m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
10	KNR 4-01 d.1 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 0.1	m ³ m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
				RAZEM	0.100

Inspektor Nadzoru
Wojciech Chowański
Nr UPK bud 50-K7.734217703

7

Młyńska 2/12- 1 sztuka

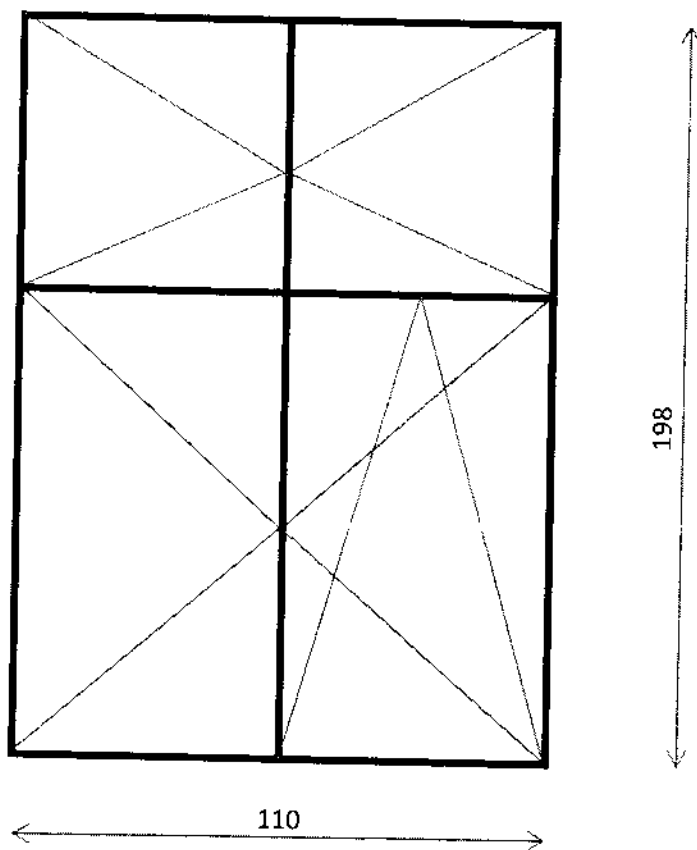


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 2.15*1.65	m ² m ²		
				3.548	
2	KNR 2-02 d.1 1001-08 analogia	Okna drewniane - mieszkaniowego fabrycznie wykonane o pow. 1.5-2.5 m2 (rozwieralno-uchylne)- wg załączonego szkicu 2.15*1.65	m ² m ²	RAZEM	3.548
				3.548	
3	KNR 4-01 d.1 0535-08 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich 0.22*1.65	m ² m ²	RAZEM	3.548
				0.363	
4	ka kalkulacja d.1 własna	Montaż nawiewników AERECO 1	szt szt	RAZEM	0.363
				1.000	
5	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szer w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 0.22*1.65	m ² m ²	RAZEM	1.000
				0.363	
6	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.65	m m	RAZEM	0.363
				1.650	
7	KNR 4-01 d.1 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł wraz z materiałem- parapetem 1	szt. szt.	RAZEM	1.650
				1.000	
8	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm (2*(2.15+1.65)*2)	m m	RAZEM	1.000
				15.200	
9	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki na odleg- łość do 1 km 0.3	m ³ m ³	RAZEM	15.200
				0.300	
10	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki - za każdy nast. 1 km 0.3	m ³ m ³	RAZEM	0.300
				0.300	
				RAZEM	0.300

Inspektor Nadzoru Budowlanego

[Podpis]
[Pieczęć]
 w zakresie ogólnobudowlanym

Pomorska 54/3- 1 sztuka

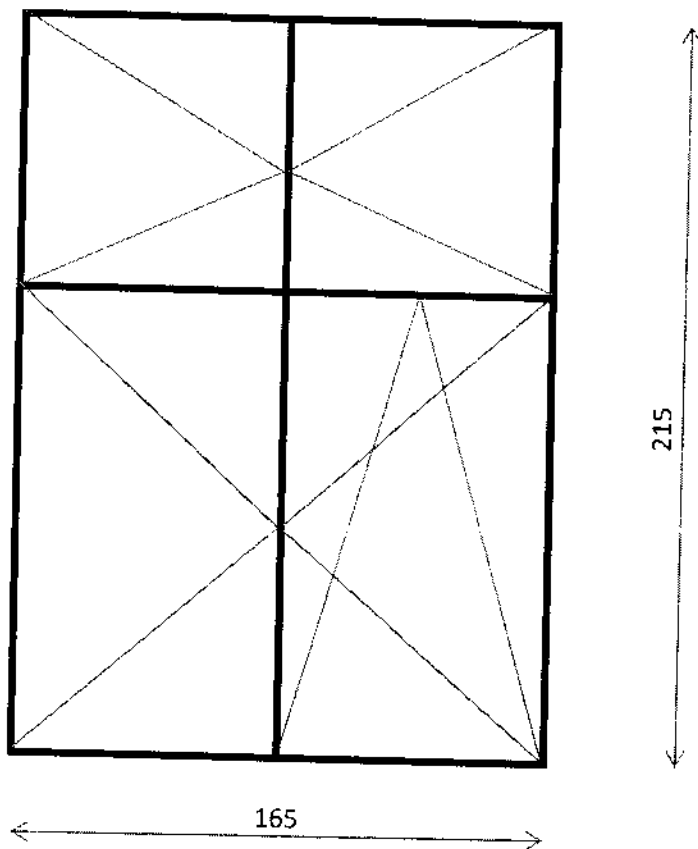

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.12*2.15	m ² m ²		
				2.408	
2	KNR 2-02 d.1 1001-08 analogia	Okna drewniane - mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.5 m2 (rozwieralno-uchylne)- wg załączonego szkicu 1.12*2.15	m ² m ²	RAZEM	2.408
				2.408	
3	KNR 4-01 d.1 0535-08 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich 0.22*1.12	m ² m ²	RAZEM	2.408
				0.246	
4	ka/kulacja d.1 własna	Montaż nawiewników AERECO 1	szt szt	RAZEM	0.246
				1.000	
5	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 0.22*1.12	m ² m ²	RAZEM	1.000
				0.246	
6	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.12	m m	RAZEM	0.246
				1.120	
7	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	RAZEM	1.120
				1.000	
8	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm (2*(1.12+2.15)*2)	m m	RAZEM	1.000
				13.080	
9	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki na odleg- łość do 1 km 0.3	m ³ m ³	RAZEM	13.080
				0.300	
10	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki - za każdy nast. 1 km 0.3	m ³ m ³	RAZEM	0.300
				0.300	
				RAZEM	0.300

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Małgorzata Tomaszewska
upr. bud. UAN-KZ/210/375/8E
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanych

Sienkiewicza 36/4- 1 sztuka

