
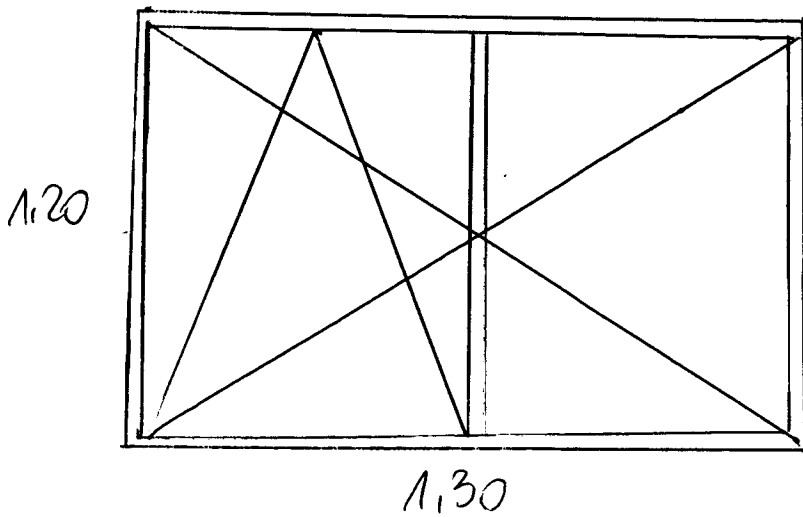


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, 1.45*1.3	m m	2.750	2.750
2	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1.45*1.45+1.3*1.2	m2 m2	3.663	3.663
3	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV 0.9*2.2	m2 m2	1.980	1.980
4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	2.000
5	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	2.000
6	analiza indywidualna	Nawiewnik higrosterowalny 2	szt. szt.	2.000	2.000
7	KNR 4-01 1204-07	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton 1.45*3+1.2*6	m2 m2	11.550	11.550
				RAZEM	11.550

Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
upr. bud. WBPB AB 7210/205/82

Szkic okna Abrahama 5/56



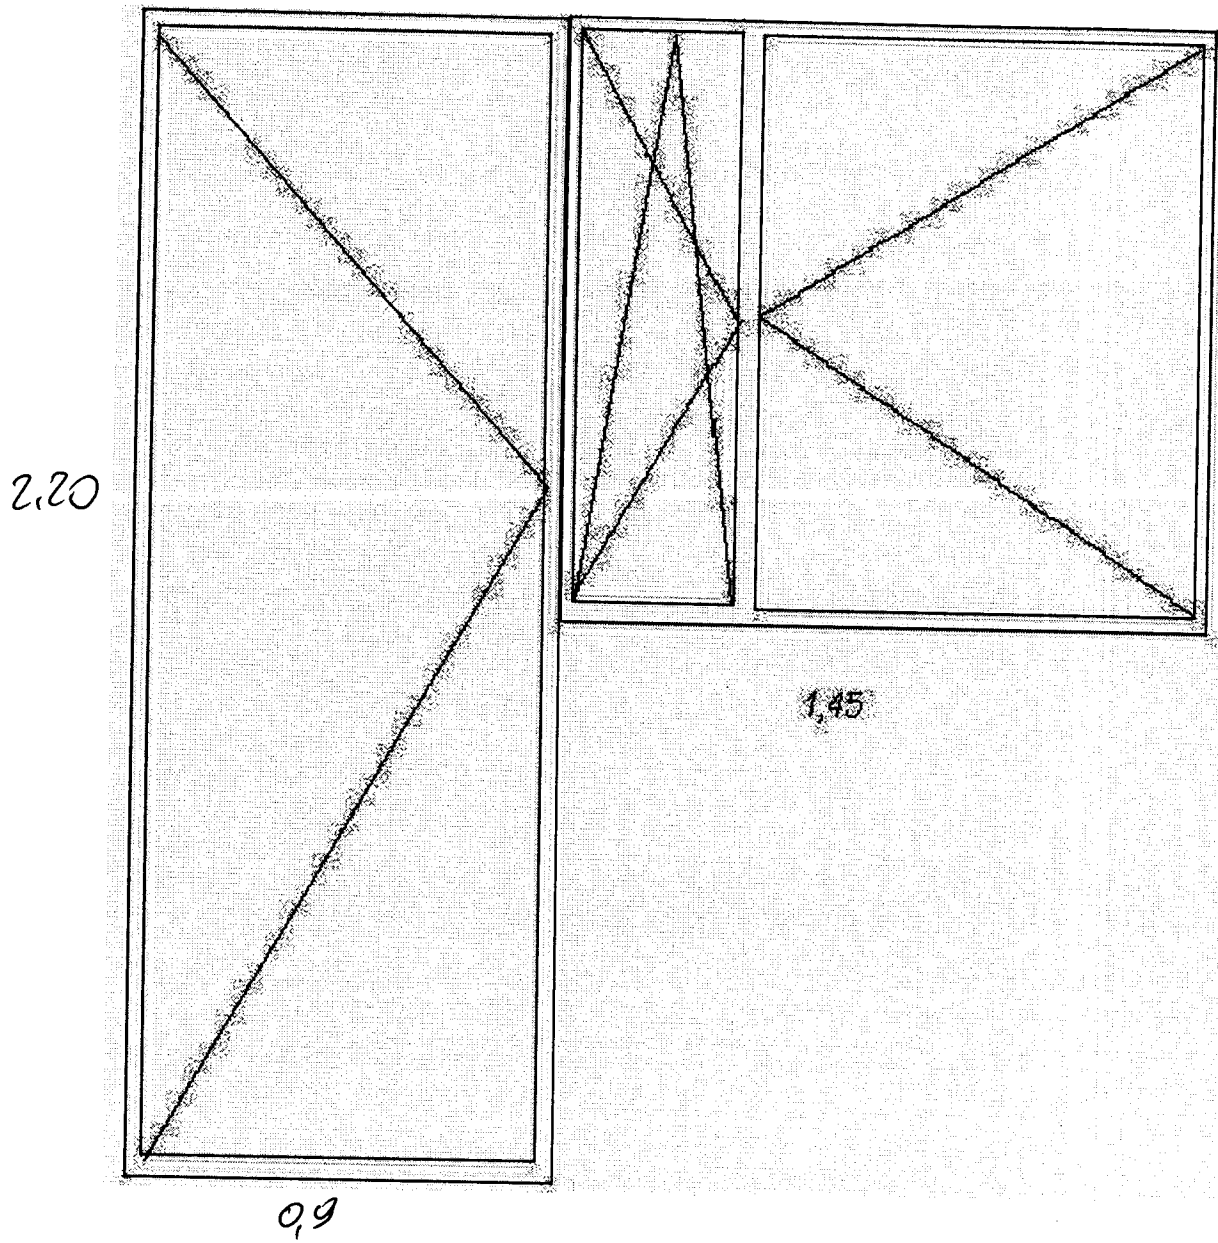


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, 1.45+0.9+1.2	m m	3.550	
				RAZEM	3.550
2	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² 1.45*1.45+0.9*1.15+1.2*1.15	m ² m ²	4.518	
				RAZEM	4.518
3	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV 0.8*2.2	m ² m ²	1.760	
				RAZEM	1.760
4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	analiza indywidualna	Nawiewnik higrosterowalny 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-01 1204-07	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton (1.45*6+1.75*2+1.13*2)*0.2	m ² m ²	2.892	
				RAZEM	2.892
7	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1.45*3+2.2+1.1*6	m m	13.150	
				RAZEM	13.150
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.8	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800

Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
upr. bud. WBPP NR 7210/205/82

8

Szkic okien Dmowskiego 10/40 w Bydgoszczy

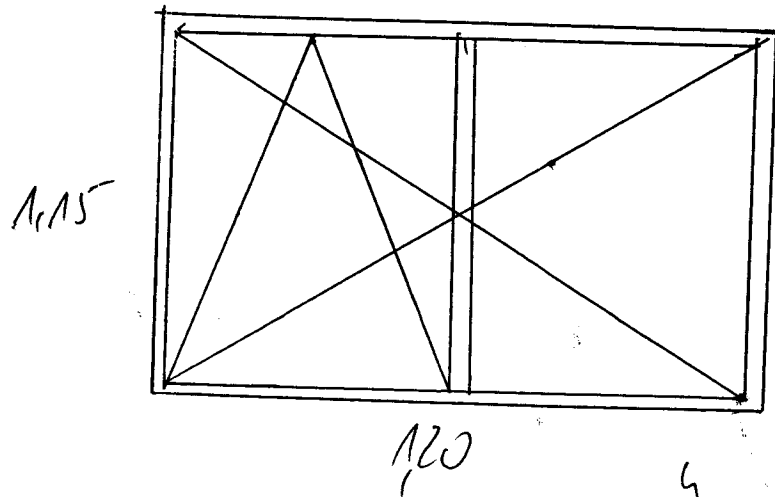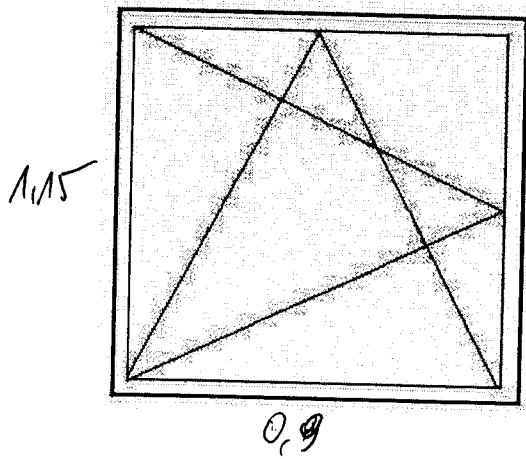
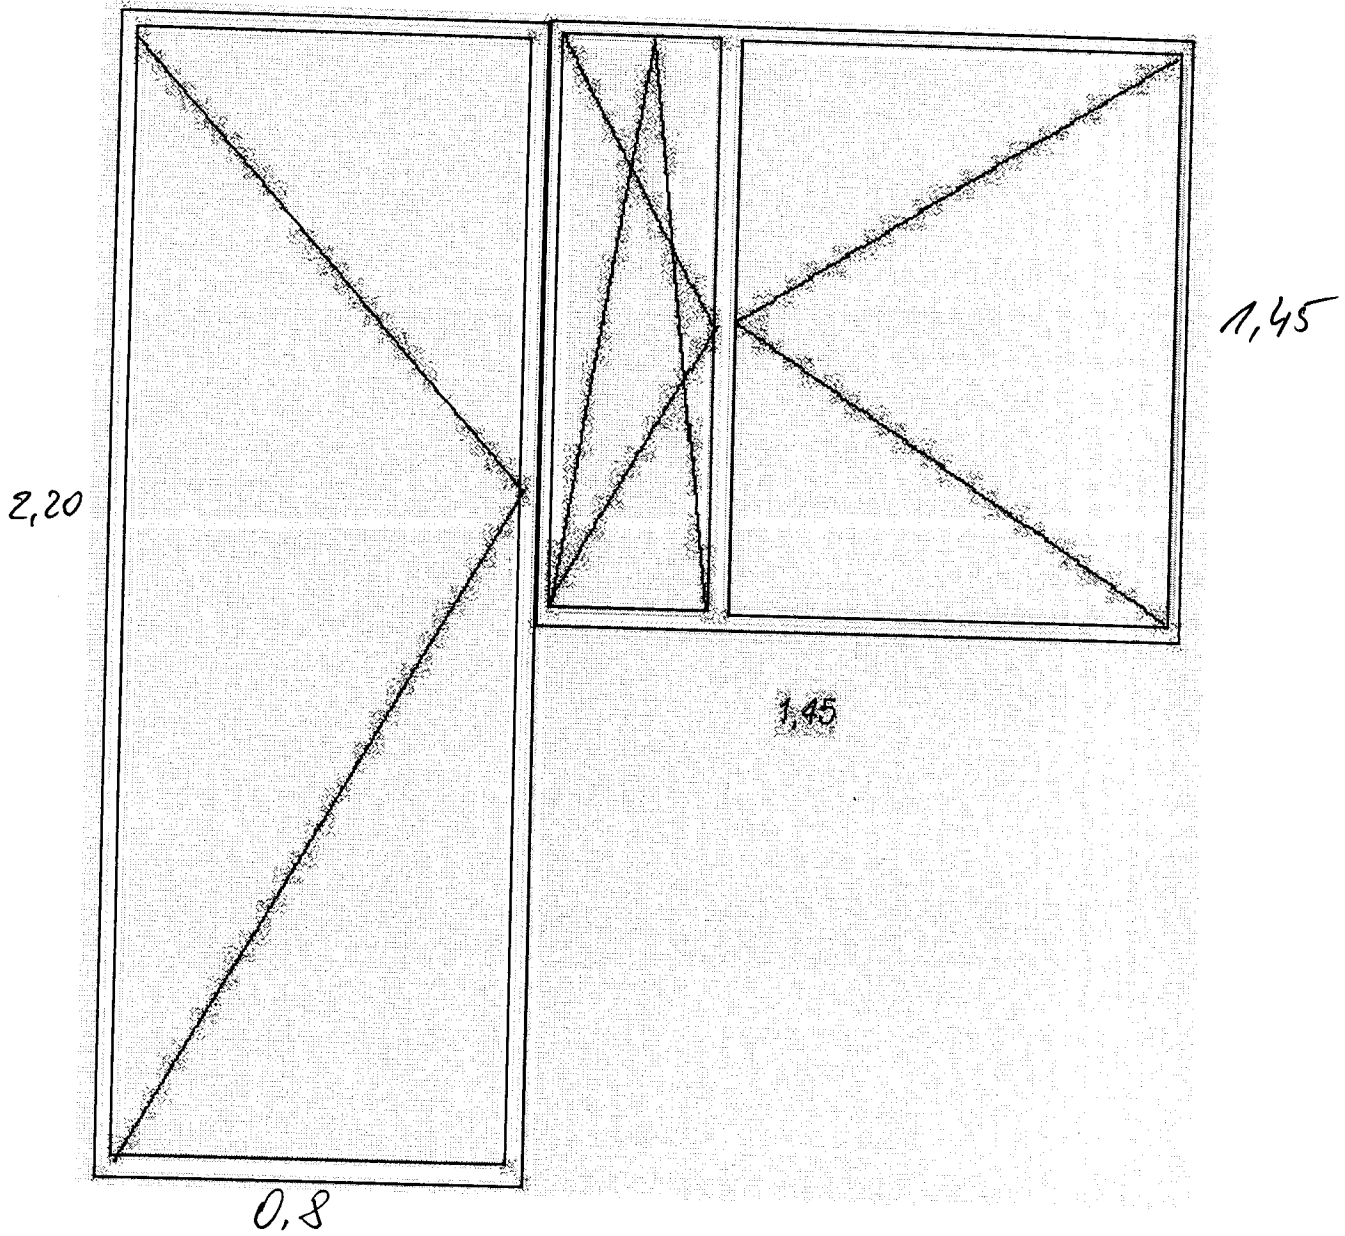


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, 1.45+1.2*2	m m	3.850	
				RAZEM	3.850
2	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1.45*1.45+1.2*1.3*2	m ² m ²	5.223	
				RAZEM	5.223
3	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV 0.8*2.2	m ² m ²	1.760	
				RAZEM	1.760
4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	analiza indywidualna	Nawiewnik higrosterowalny 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-01 1204-07	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton (1.45*6+1.75*2+1.13*2)*0.2	m ² m ²	2.892	
				RAZEM	2.892
7	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1.45*3+2.2+1.1*6	m m	13.150	
				RAZEM	13.150
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.8	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800

Inspektor Nadzoru

Leszek Saganowski
upr. bud. WRPP Nr 7210/205/82

Szkic okien Dmowskiego 10/64 w Bydgoszczy

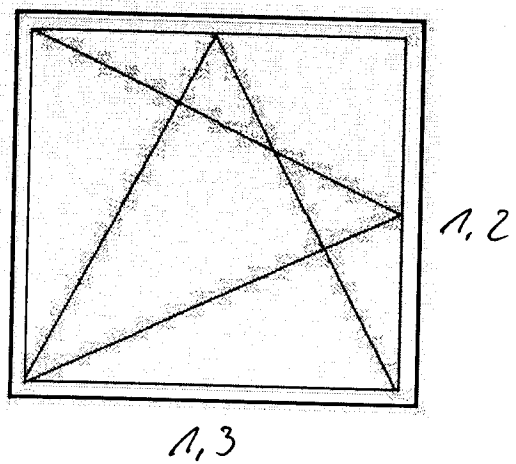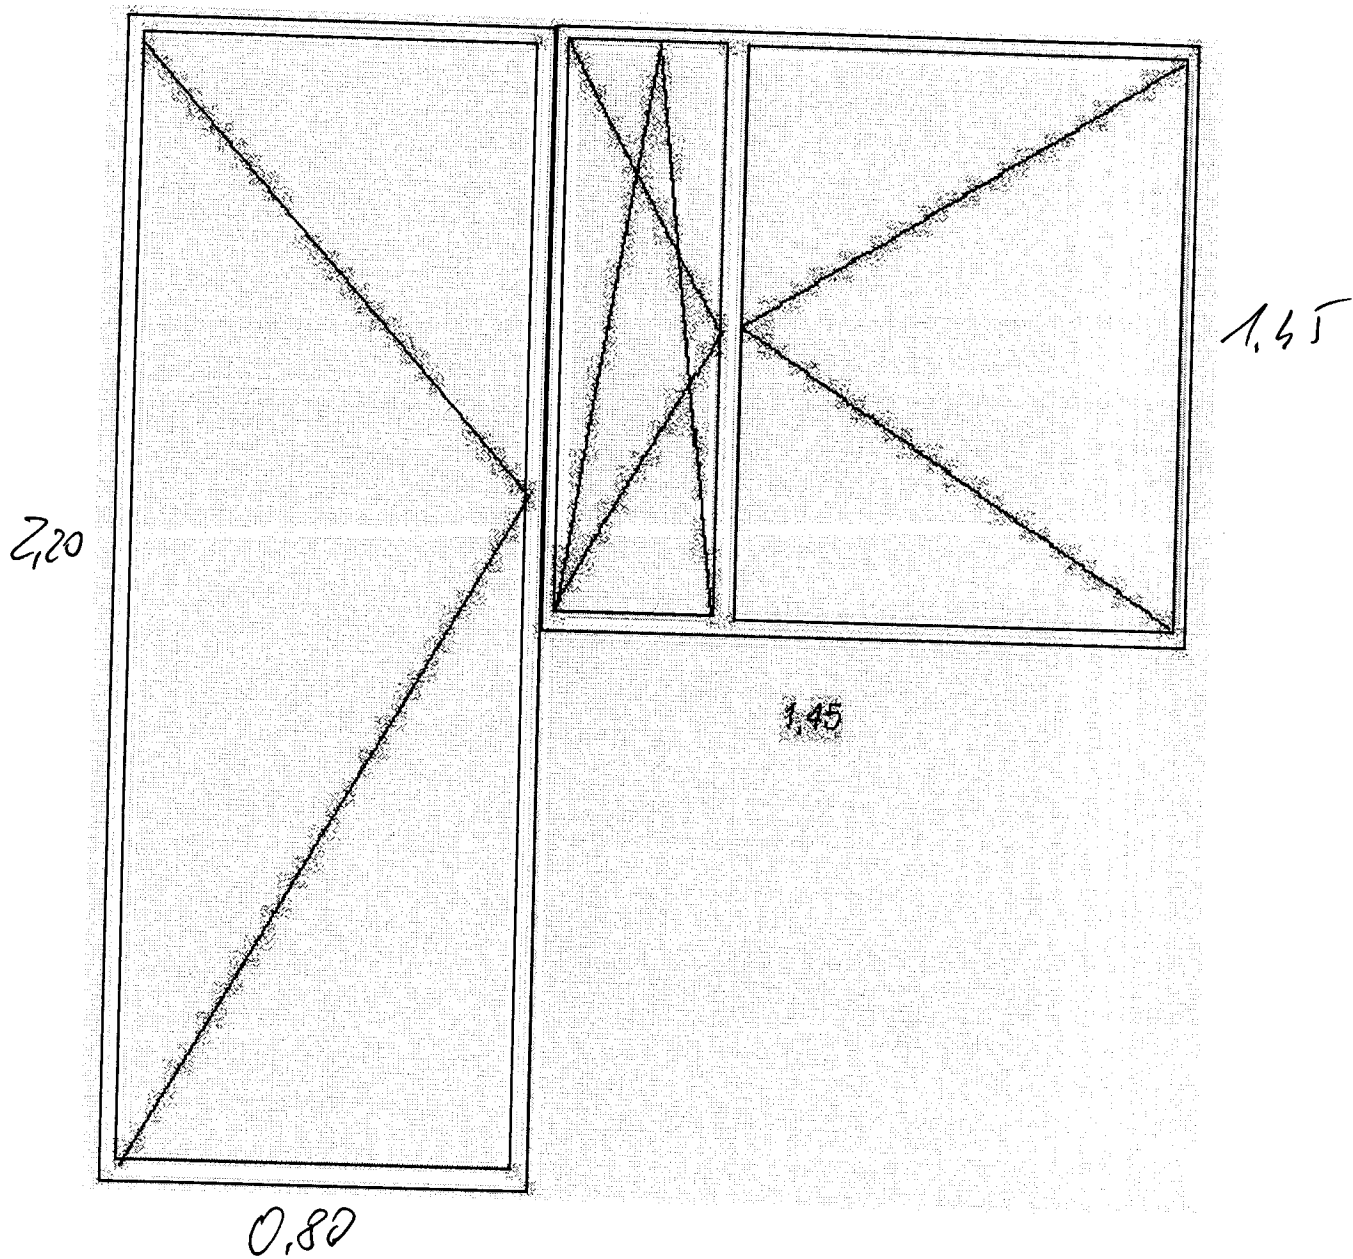


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.1*3	m m	3.300	
				RAZEM	3.300
2	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² 1.14*1.6*3	m ² m ²	5.472	
				RAZEM	5.472
3	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej Analogia z blachy powlekanej 1.12*0.18*3	m ² m ²	0.605	
				RAZEM	0.605
5	analiza indywidualna	Nawiewnik higrosterowalny 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1.2*3+1.6*6	m m	13.200	
				RAZEM	13.200
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.8	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800

Inspektor Nadzoru

Leszek Saganowski
upr. bud. WPP Nr 7210/205/82


Szkic okien Nakielska 8/1

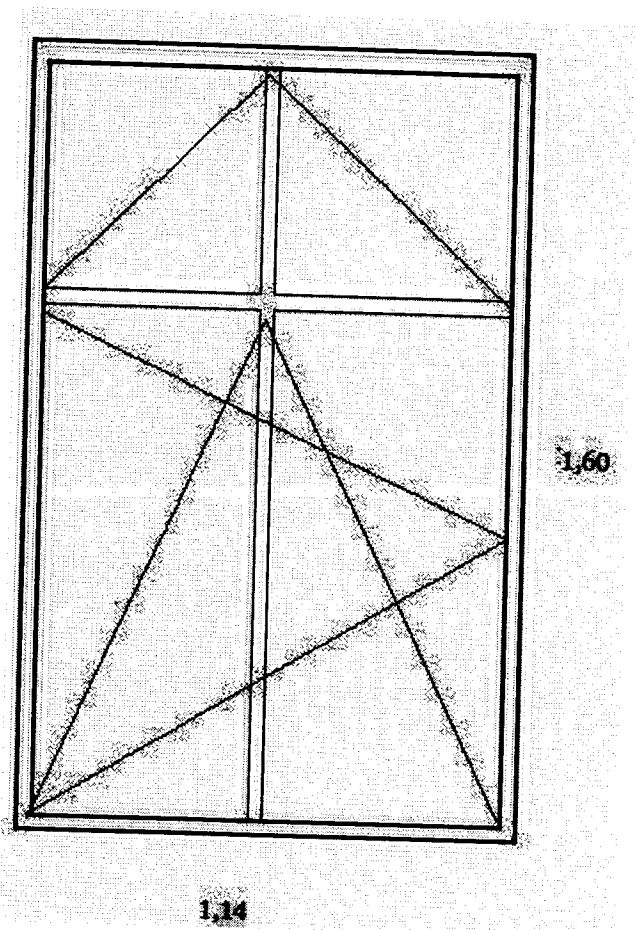

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.25	m m	1.250	1.250
2	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² 1.28*1.95	m ² m ²	2.496	2.496
3		nawiewnik higrosterowalny 1	szt szt	1.000	1.000
4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	1.000
5		parapet z PCV 1	szt szt	1.000	1.000
6	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 4.8	m m	4.800	4.800
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.4	m ³ m ³	0.400	0.400
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.4	m ³ m ³	0.400	0.400
				RAZEM	0.400

Inspektor Nadzoru
K. Saganowski
KDE NR 7210/205/B2


Szkic okien Nakielska 42/2 w Bydgoszczy

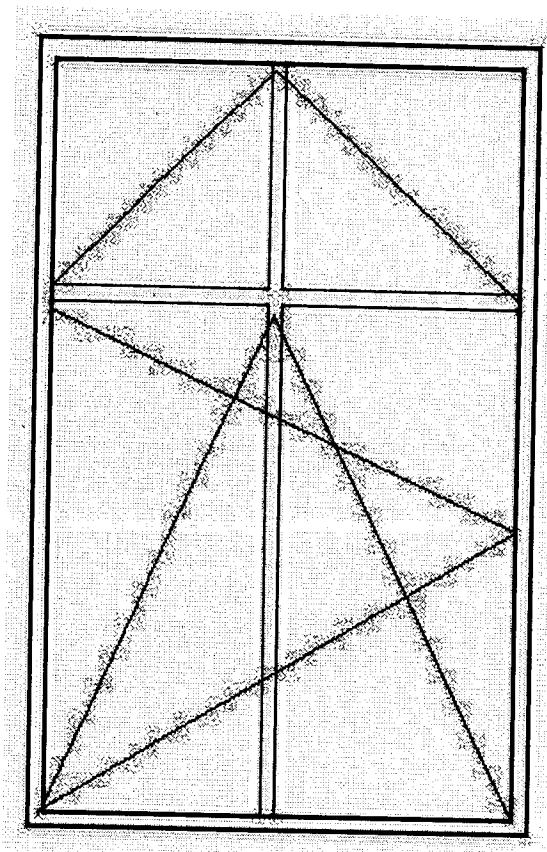

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.25*2	m		
			m	2.500	
				RAZEM	2.500
2	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1.28*1.95*2	m ²		
			m ²	4.992	
				RAZEM	4.992
3		nawiewnik higrosterowalny 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5		parapet z PCV 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 9.2	m		
			m	9.200	
				RAZEM	9.200
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.8	m ³		
			m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.8	m ³		
			m ³	0.800	
				RAZEM	0.800

Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
upr. bud. WZRP NR 7210/205/82




№ 42/4 39090000

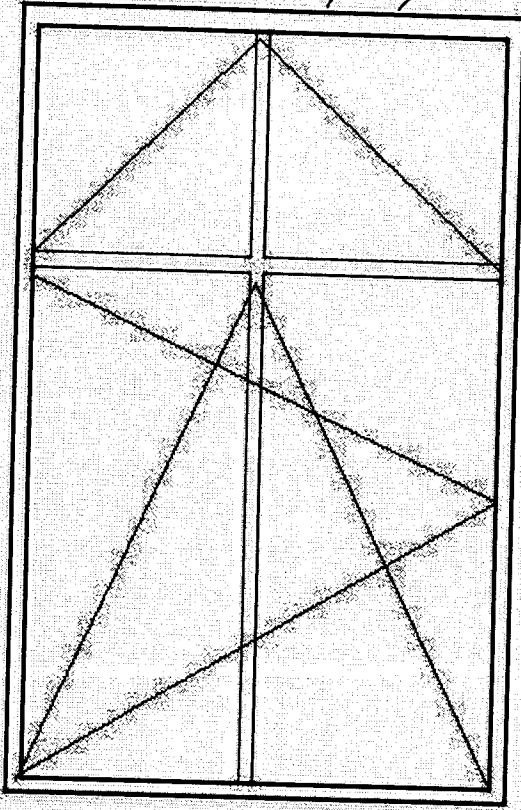

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-11	Wycucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 0.5+0.8+2.15	m m	 3.450	 3.450
2	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m ² 0.55*0.60	m ² m ²	 0.330	 0.330
3	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 2.1*1.67	m ² m ²	 3.507	 3.507
4	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² 0.87*1.43	m ² m ²	 1.244	 1.244
5		nawiewnik higrosterowalny 3	szt szt	 3.000	 3.000
6	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
7	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników z PCV ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
8		parapet z PCV 3	szt szt	 3.000	 3.000
9	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 0.55*3+0.87*2+1.43*4+2.1*2+1.67*4	m m	 19.990	 19.990
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 0.8	m ³ m ³	 0.800	 0.800
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km 0.8	m ³ m ³	 0.800	 0.800
				RAZEM	0.800

Inspektor Nadzoru
Leszek Siganowski
upr. bud. WBRP/NB 710/205/R2


Szkic okien Nakielska 193A/2 w Bydgoszczy

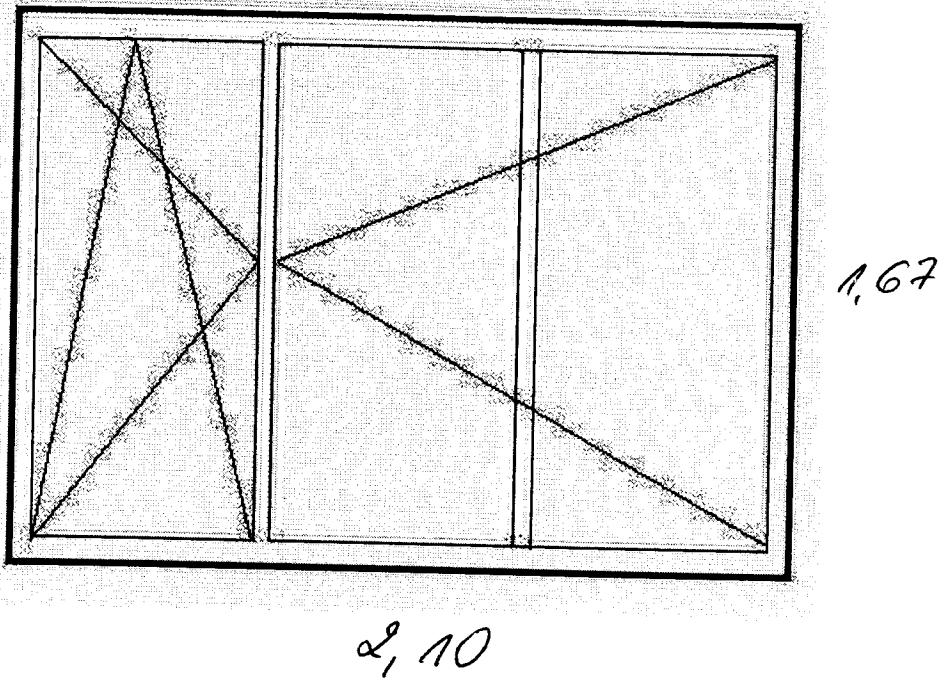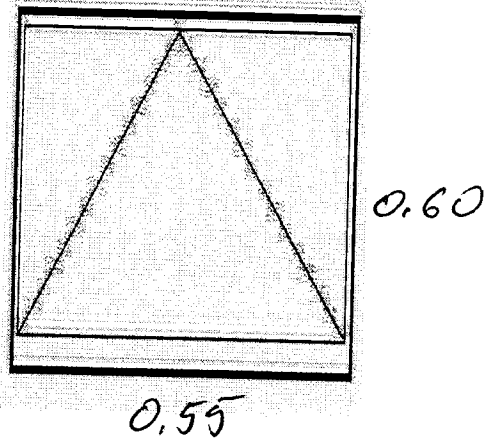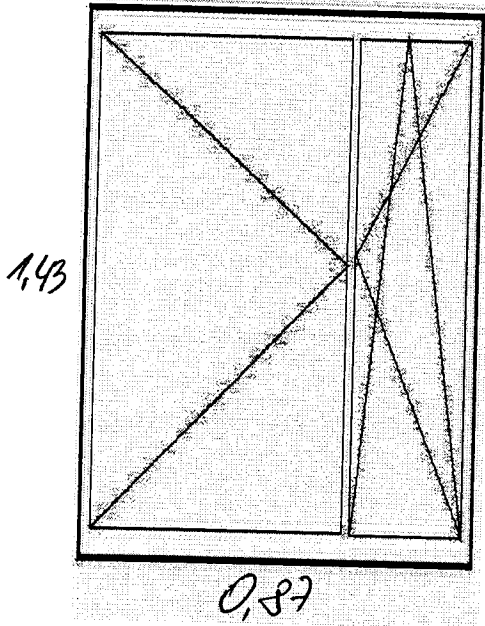

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-11	Wycucie z muru podokienników drewnianych, 1.45*3	m m	4.350	
2	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1.45*1.45*3+0.93*1.45+1*1.45	m ² m ²	9.106	4.350
3	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV 0.8*2.2	m ² m ²	1.760	9.106
4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	4.000	1.760
5	analiza indywidualna	Nawiewnik higrosterowalny 3	szt. szt.	3.000	4.000
6	KNR 4-01 1204-07	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton 1.45*9+2.2	m ² m ²	15.250	3.000
7	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1.45*9+2.2	m m	15.250	15.250
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.5	m ³ m ³	1.500	15.250
				RAZEM	1.500

Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
upr. bug 7210/205/82


Skic okien M. Konopnickiej 4/81 w Bydgoszczy

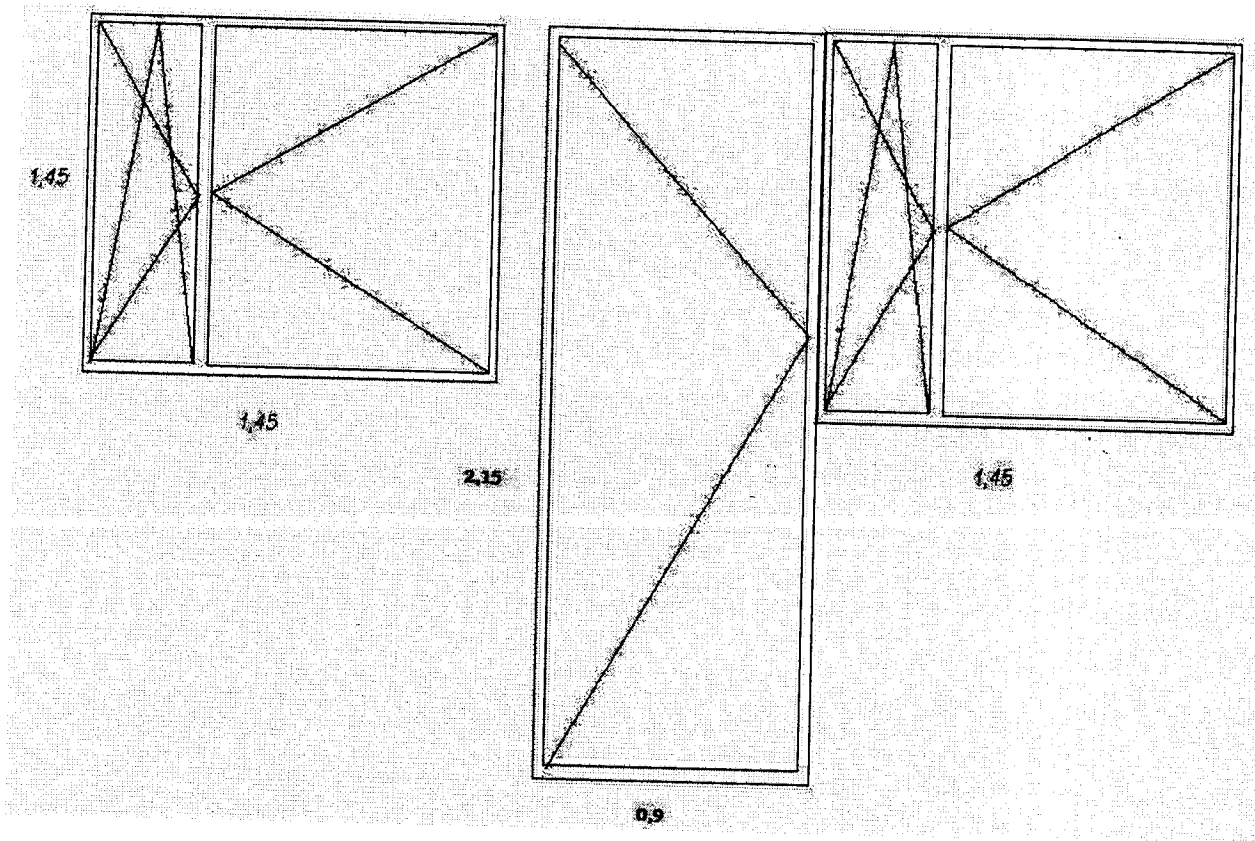

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, 0.87	m m	0.870	
2	KNR 0-19 0929-04	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 0.87*1.16	m2 m2	1.009	0.870
3	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	1.009
4	analiza indywidualna	Nawiewnik higrosterowalny 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000


Inspektor Nadzoru
Leszek Suganowski
upr. bud. WzSP Nr 7210/205/82

Szkic okna Stawowa 57/11 w bydgoszczy

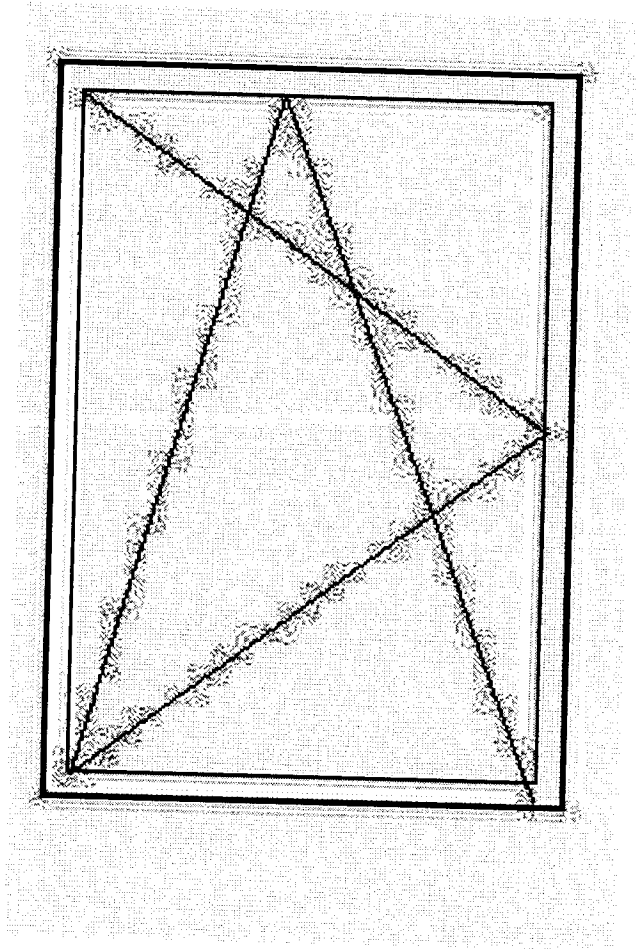


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, 1.45+1.15+0.87+1.75	m m	5.220	
2	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² 1.45*1.45+1.45*1.15+0.87*1.16+1.45*1.75	m ² m ²	RAZEM 7.317	5.220
3	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV 0.8*2.2	m ² m ²	RAZEM 1.760	7.317
4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.760
5	analiza indywidualna	Nawiewnik higrosterowalny 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
6	KNR 4-01 1204-07	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton 1.45*3+2.2	m ² m ²	RAZEM 6.550	1.000
7	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1.45*3+2.2	m m	RAZEM 6.550	6.550
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.8	m ³ m ³	RAZEM 0.800	6.550
				RAZEM	0.800

Station 597

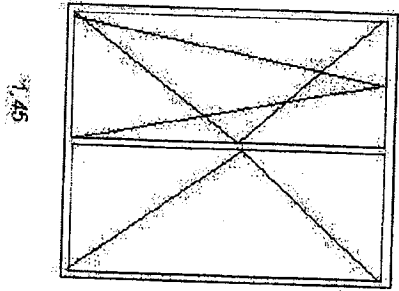


145

145

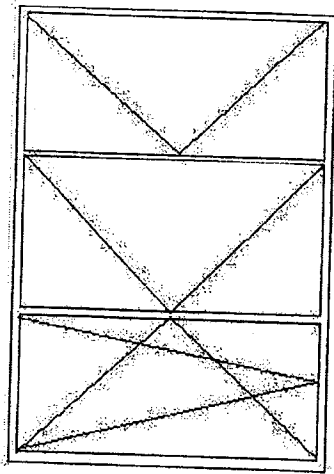


146

145



145

145




87

116

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie podokienników drewnianych 1.2*2	m m	2.400	
				RAZEM	2.400
2	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na jednoramowe o istniejącym podziale 1.23*1.80+1.6*0.8	m ² m ²	3.494	
				RAZEM	3.494
3	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych + podokiennik 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej analogia z blachy powlekanej 1*0.2+0.6*0.2	m ² m ²	0.320	
				RAZEM	0.320
5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1.23+1.8*2+1.06+0.8*2+2*1.8+1.6	m m	12.690	
				RAZEM	12.690
6	analiza indywidualna	nawiewnik 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000


Szkic okien Ułańska 1/2a

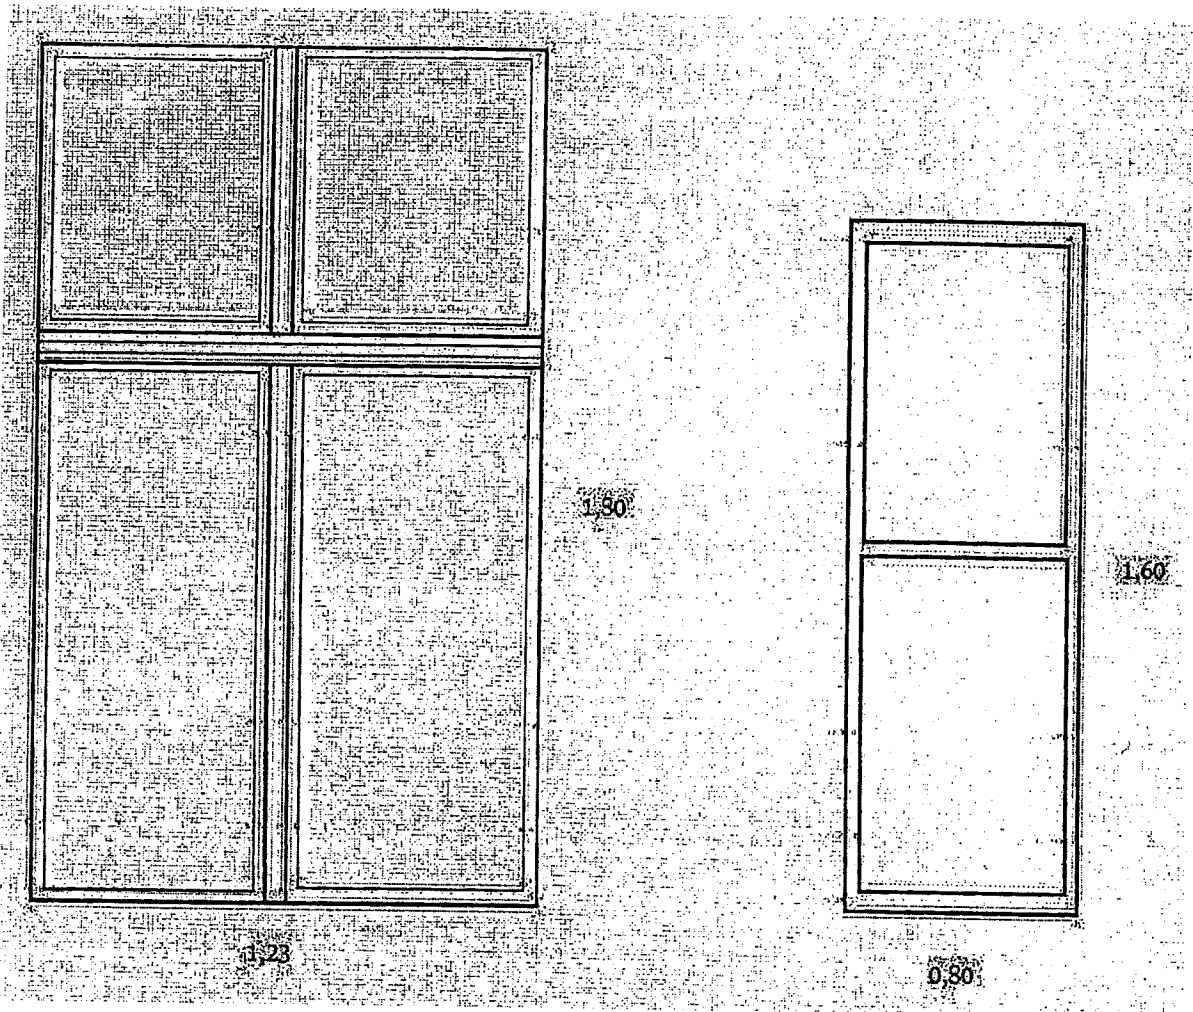


Mie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane jednoramowe o pow. do 2.5 m ² 1.31*1.88*2+1.18*1.80	m ² m ²	7.050	
				RAZEM	7.050
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.25*3	m m	3.750	
				RAZEM	3.750
3	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	analiza indywidualna	Nawiewnik higrosterowalny 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1.18*4+1.8*8	m m	19.120	
				RAZEM	19.120

Szkic okien Wierzbickiego 3/15

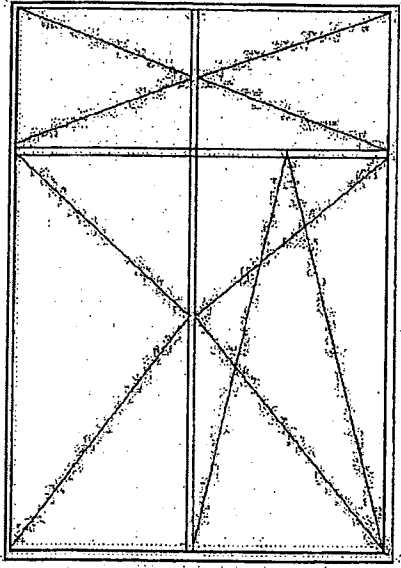

1,80

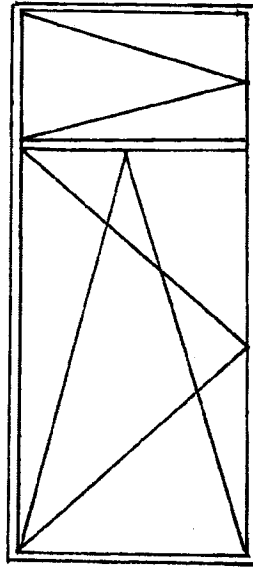

1,80

1,18
