

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne drewniane wzmocnione, wejście pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² z nr lokalu, dwoma zamkami, wizjerem 0.90*2.05	m ²		
			m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2.05*4+1*2	m		
			m	10.200	
				RAZEM	10.200
6	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.2	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.2	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200

Inspektor Nadzoru
Leszek Soganołowski
UDL. BUD. W RP. NR 7410/2005/02

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.4	m	1.400	
				RAZEM	1.400
3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne drewniane wzmocnione, wejściowe pełne jednoodzielne o powierzchni do 2.0 m2 z nr lokalu, dwoma zamkami, wizjerem 0.95*2.05	m ²		
			m ²	1.948	
				RAZEM	1.948
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2.05*4+1*2	m		
			m	10.200	
				RAZEM	10.200
7	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200

Inspektor Nadzoru
 Leszek Sagnowski
 upr. bud. WAPP NR 7210/2051R


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.46*2.4	m ² m ²		
				3.504	
2	KNR 2-02 1019-07	Skrzydła drzwiowe , wejściowe z pionowym naswietlem , wzmacnione wejściowe do budynku wg. załączonego szkicu malowane lakierobeją w kolorze brązowym 1.10*2.10	m ² m ²		
				2.310	
3	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane zewnętrzne dwukrotnie malowane i szklone na budowie 1.46*2+2.4*2	m m		
				7.720	
4	KNR 4-01 0318-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł 1.46*2.4	m ² m ²		
				3.504	
5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2.4*2+1.45	m m		
				6.250	
6	KNR 4-01 0920-23	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych 'Yale' amalogia samozamykacza 1	szt. szt.		
				1.000	
7	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.		
				1.000	
8	analiza indywidualna	Dorobienie kluczy 8	szt. szt.		
				8.000	
9	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe do 0,7 m2 1	szt. szt.		
				1.000	
10	KNR 4-01 0322-05	Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni do 1.0 m2 w podłogach betonowych 1	szt. szt.		
				1.000	
11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.4	m ³ m ³		
				0.400	
12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.4	m ³ m ³		
				0.400	
				RAZEM	0.400

Inspektor Nadzoru
 Leszek Siganowski
 15 710 205 82

Lp.	Podstawa	Opis i wycięzenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.1*2.35	m ² m ²	2.585	
				RAZEM	2.585
2	KNR 2-02 1019-07	Skrzydła drzwiowe , wejściowe naswietlem , wzmacnione wejściowe na klatkę wg. załączonego szkicu malowane lakierobejcą w kolorze brązowym 0.9*2.	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
3	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane zewnętrzne z naswietlem dwukrotnie malowane i szklone na budowie o wymiarach 2,3*1,1 2.35*2+1.1	m m	5.800	
				RAZEM	5.800
4	KNR 4-01 0318-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł 1.1*2.3	m ² m ²	2.530	
				RAZEM	2.530
5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2.3*2+1.1	m m	5.700	
				RAZEM	5.700
6	KNR 4-01 0920-23	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych 'Yale' amalogia samozamykacza 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	analiza indywidualna	Dorobienie kluczy 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.4	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
10	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.4	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400

Inspektor Nadzoru
Leszek Szpakowski
upr. bud. WBBP NR 7210205162

Szkic drzwi Orłowity 17 w Bydgoszczy

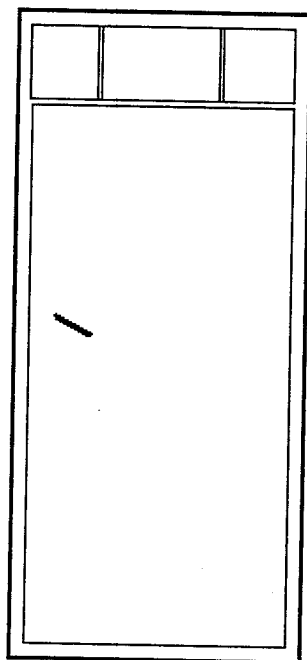

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.1*2.45	m ² m ²	2.695	
				RAZEM	2.695
2	KNR 2-02 1019-07	Skrzydła drzwiowe , wejściowe naswietlem , wzmocnione wejściowe na klatkę wg. załączonego szkicu malowane lakierobejcą w kolorze brązowym 0.9*2.	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
3	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane zewnętrzne z naświetlem dwukrotnie malowane i szklone na budowie 2.3*2+1.1	m m	5.700	
				RAZEM	5.700
4	KNR 4-01 0318-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł 1.1*2.3	m ² m ²	2.530	
				RAZEM	2.530
5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2.4*2+1.2	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 4-01 0920-23	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych 'Yale' analogia samozamykacza 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	analiza indywidualna	Dorobienie kluczy 5	szt szt	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.4	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
10	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.4	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400

Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
upr. budowlana NR 7210/20518

Skic skrzydła drzwi Nakielska 60 w Bydgoszczy

