

Zadanie Nr 1

kossaka 75 m 3 okno

OBMIAR

ROM-2


①

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.23	m m	1.230	
				RAZEM	1.230
2		nawiewnik higrosterowalny 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 1.23*1.7	m ² m ²	2.091	
				RAZEM	2.091
4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		parapet z PCV 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1.7*2+1.2	m m	4.600	
				RAZEM	4.600
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.3	m ³ m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.3	m ³ m ³	0.300	
				RAZEM	0.300

Inspektor Nadzoru

Leszek Caganowski
upr. bud. WBP nr 7210/205/82

Szkic okna Kossaka 75 of 1/3 w Bydgoszczy

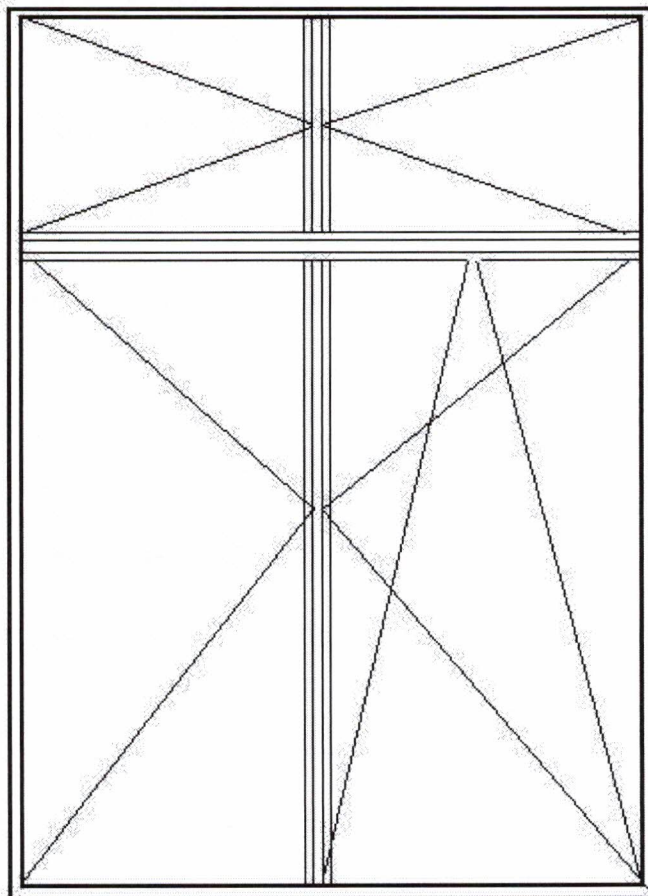


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.1*2	m m	2.200	
				RAZEM	2.200
2		nawiewnik higrosterowalny 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1.05*1.25*2	m ² m ²	2.625	
				RAZEM	2.625
4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5		parapet z PCV 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
6	NNRNKB 202 0541- 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 1*0.2*2	m ² m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
7	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1.2*6	m m	7.200	
				RAZEM	7.200
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.8	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.8	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800

Inspektor Nadzoru

Leszek Saganowski
upr. bud. WRPP NR 7210/205/82



Szkic okien od strony szczytu-podwórza Kordeckiego 27/3 w Bydgoszczy

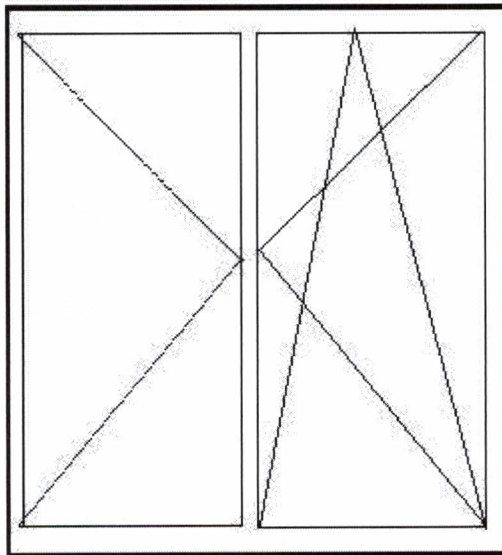

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.1*2+0.6	m m	2.800	
				RAZEM	2.800
2		nawiewnik higrosterowalny 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 1.1*1.8*2+0.6*0.8	m ² m ²	4.440	
				RAZEM	4.440
4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5		parapet z PCV 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1.8*4+1.1*2+0.6*3	m m	11.200	
				RAZEM	11.200
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.6	m ³ m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.6	m ³ m ³	0.600	
				RAZEM	0.600

INSPEKCJA NACZOTU
Leszek Saganowski
upr. bud. WBPP NB 7210/205/82


Szkic okien Na Wzgórzu 5/1A w Bydgoszczy

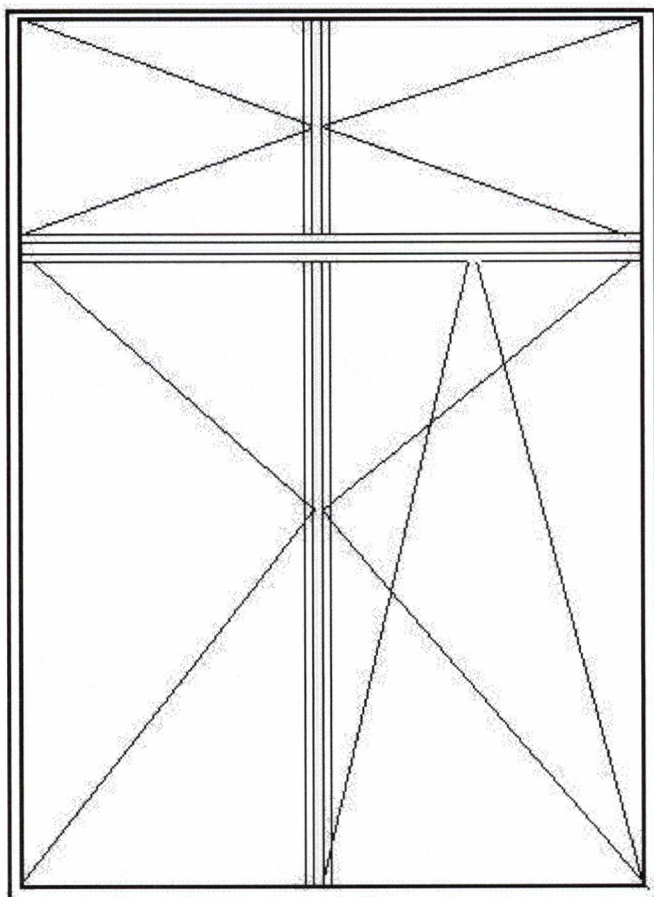

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.1*3	m m	3.300	
				RAZEM	3.300
2		nawiewnik higrosterowalny 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 1.1*1.8*3	m ² m ²	5.940	
				RAZEM	5.940
4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5		parapet z PCV 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1.8*6+1.1*3	m m	14.100	
				RAZEM	14.100
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.6	m ³ m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.6	m ³ m ³	0.600	
				RAZEM	0.600

Inspektor Nadzoru
Leszek Siganowski
nr. bud. WBP. NR 721070518.2

Szkic okien Na Wzgórzu 10/2 w Bydgoszczy

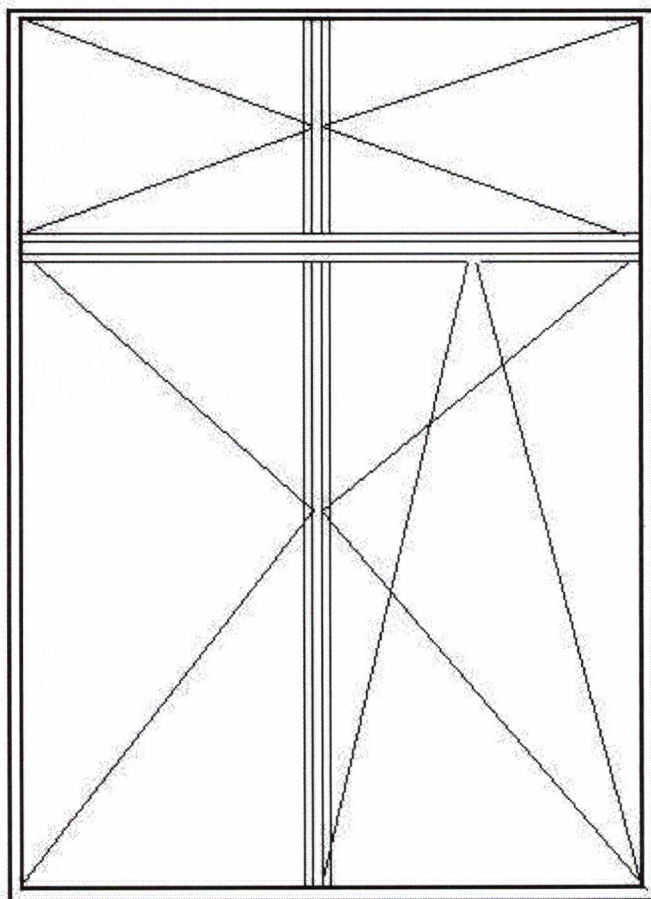


A, B

A, A

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.1*4	m m	4.400	
				RAZEM	4.400
2		nawiewnik higrosterowalny 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1.1*1.9*4	m ² m ²	8.360	
				RAZEM	8.360
4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5		parapet z PCV 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1.9*8+1.1*4	m m	19.600	
				RAZEM	19.600
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.8	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.8	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800

Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
upr. bud. WBPP NB 72/0/205/82

Szkic okien ul. Wincentego Pola 6 of 2/24 w Bydgoszczy

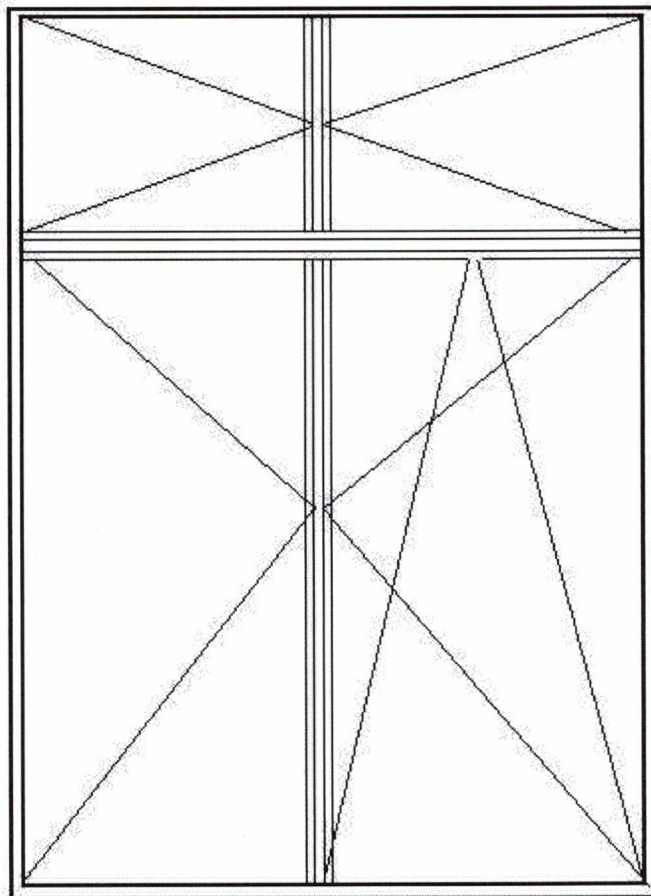

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.1+1.25+1.52	m m	3.870	
				RAZEM	3.870
2		nawiewnik higrosterowalny 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1*1.85+1.2*1.85	m ² m ²	4.070	
				RAZEM	4.070
4	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 1.5*1.85	m ² m ²	2.775	
				RAZEM	2.775
5	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6		parapet z PCV 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1.9*6+1.5+1.2+1.1	m m	15.200	
				RAZEM	15.200
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.8	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.8	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800





 Nadzoru

 Stanisławowski

 18 7210205/82

Szkic okien Wincentego Pola 17/9

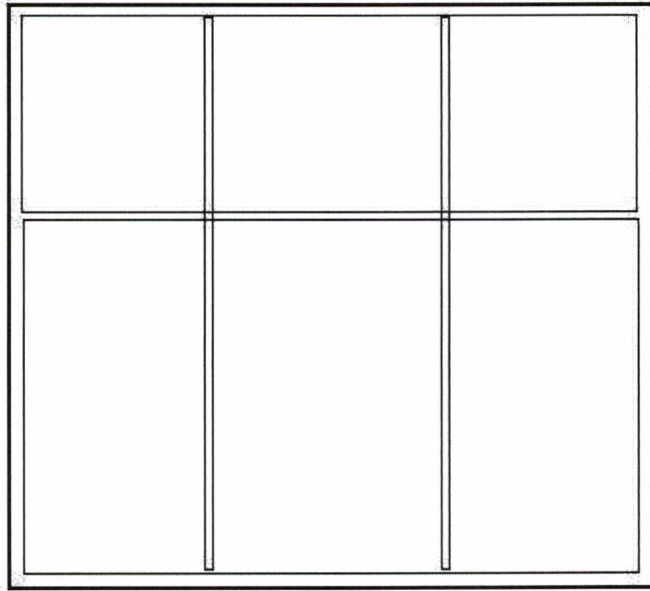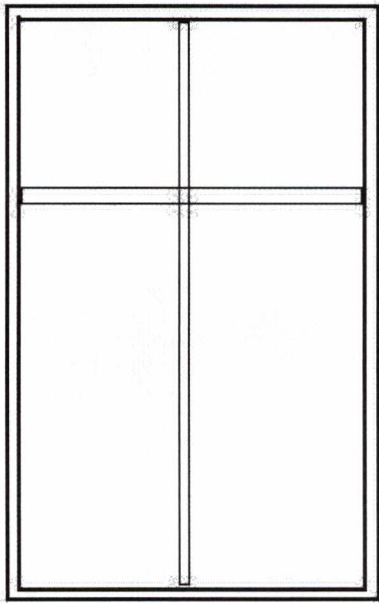


Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1.15*1.45*3	m ² m ²	5.003	
				RAZEM	5.003
2	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z pcv do 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	analiza in- dywidualna	podokiennik z pcv 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	analiza in- dywidualna	Nawiewnik higrosterowalny 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-01 1204-07	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton 1.45*3+6*1.15	m ² m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
6	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1.45*3+6*1.15	m m	11.250	
				RAZEM	11.250
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 0.4	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Leszek Sgarbowski
upr. bud. WBP/NE/7210/205/82
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/50/016/04

Szkic okien Okrzei 6/58 – 3 szt.

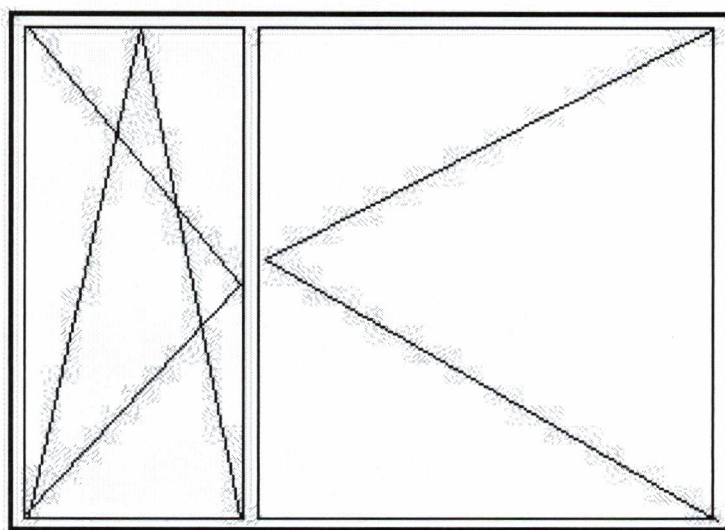



1,15

1,45

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,	m		
		1.3+1.2	m	2.500	
				RAZEM	2.500
3	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej analogia z blachy powlekanej plastizolem	m ²		
		1.1*0.2+1.05*0.2	m ²	0.430	
				RAZEM	0.430
4	KNR-W 2- 02 1005-03	Okna jednoramowe użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o powierzchni do 2.0 m2	m ²		
		1.2*1.90+1.1*1.5	m ²	3.930	
				RAZEM	3.930
5	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6		podokiennik drewniany	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		1.45*4+2.05*8	m	22.200	
				RAZEM	22.200
8	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Leszek Saganowski
 upr. bud. WBPP-NB-7210/205/82
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/0161/04

Szkic okna na klatce schodowej Batorego 3 w Bydgoszczy

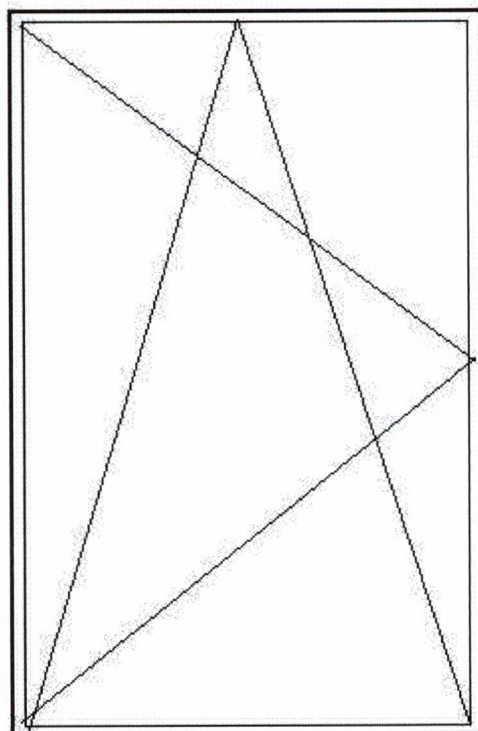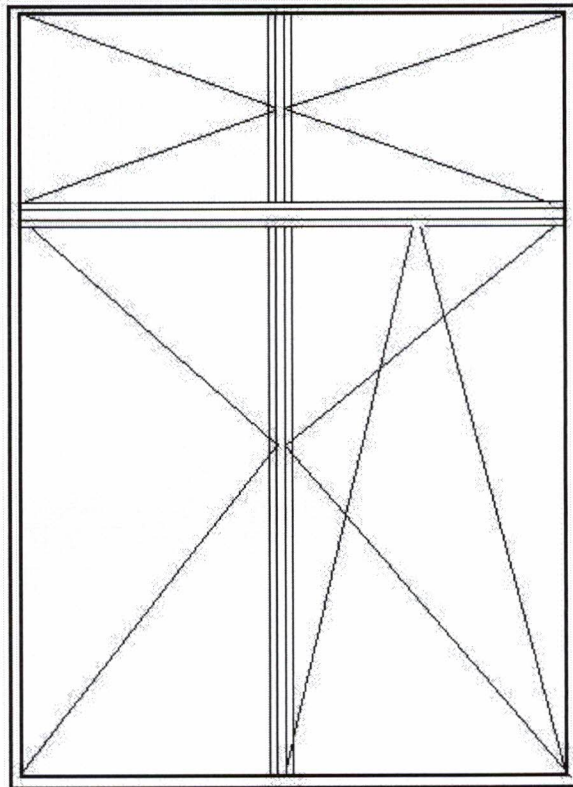


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.15	m m	 1.150	
				RAZEM	1.150
2	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników do 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 0-19 d.1 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² 1.15*1.91	m ² m ²	 2.197	
				RAZEM	2.197
4	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników pcv do 1,5 m 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	d.1 analiza indywidualna	nawiewnik higrosterowalny 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1.15+1.9*2	m m	 4.950	
				RAZEM	4.950
7	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.3	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.300
8	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.3	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.300

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Leszek Saganowski
 upr. bud. WBPP-NB-7210/205/82
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/0161/04

Szkic okna Orla 41/2 w Bydgoszczy

1,91

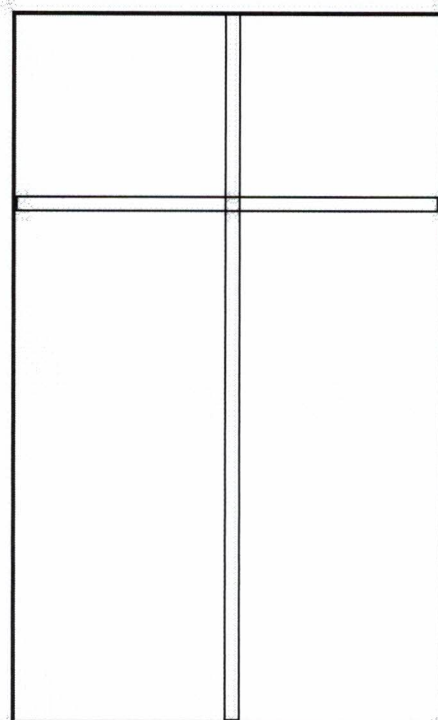



1,15

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.2+1.70	m m		
				2.900	
				RAZEM	2.900
2	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników do 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 d.1 0321-02	Obsadzenie podokienników pcv ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 0-19 d.1 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1.15*1.80	m ² m ²		
				2.070	
				RAZEM	2.070
5	KNR 0-19 d.1 0928-11	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych trzydziel- nych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 1.65*1.94	m ² m ²		
				3.201	
				RAZEM	3.201
6	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników pcv do 1,5 m 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 d.1 0321-02	Obsadzenie podokienników pcv o długości pow 1,5 m 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
8	d.1 analiza in- dywidualna	nawiewnik higrosterowalny 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1.15+1.8*2+1.94*2+1.65	m m		
				10.280	
				RAZEM	10.280
10	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 0.4	m ³ m ³		
				0.400	
				RAZEM	0.400
11	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km 0.4	m ³ m ³		
				0.400	
				RAZEM	0.400

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Leszek Saganowski
upr. bud. WBPP/18/7210/205/82
w specjalności konstr. ogólnobudowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0161/14

Szkic okien Stroma 31/3 w Bydgoszczy

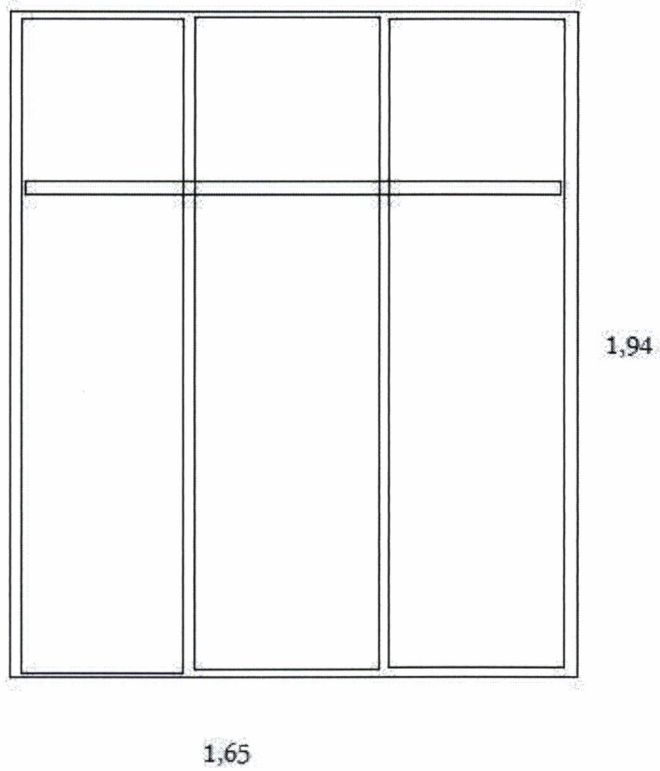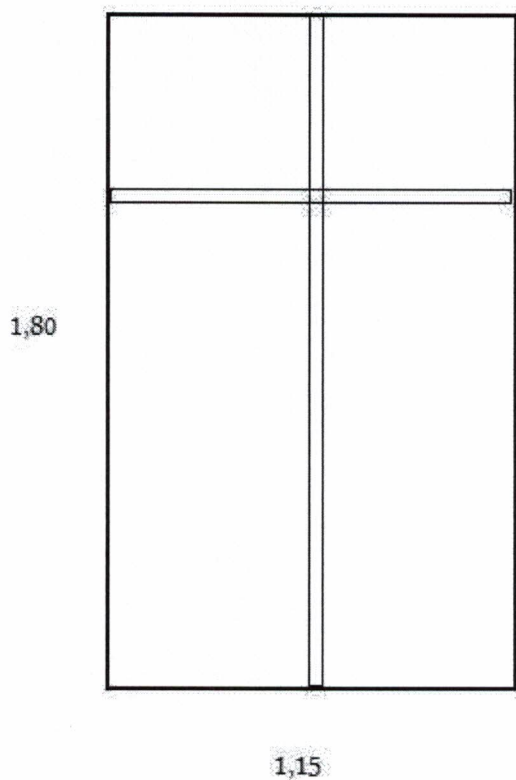


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, 1.15*2	m m	2.300	
				RAZEM	2.300
2	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej analogia z blachy powlekanej plastizolem 1.0*0.2*2	m ² m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
3		nawiewnik higrosterowalny 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane o pow. do 2.5 m ² 1*1.37*2	m ² m ²	2.740	
				RAZEM	2.740
5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2*1+4*1.4	m m	7.600	
				RAZEM	7.600
6		podokiennik drewniany doliczyć parapet 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
 Lechek Saganowski
 upr. bud. WP/7-NB-7210/205/82
 w specjalności Konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/016/04

Podwale 8/8



Stolarka okienna
ul. Podwale 8/8

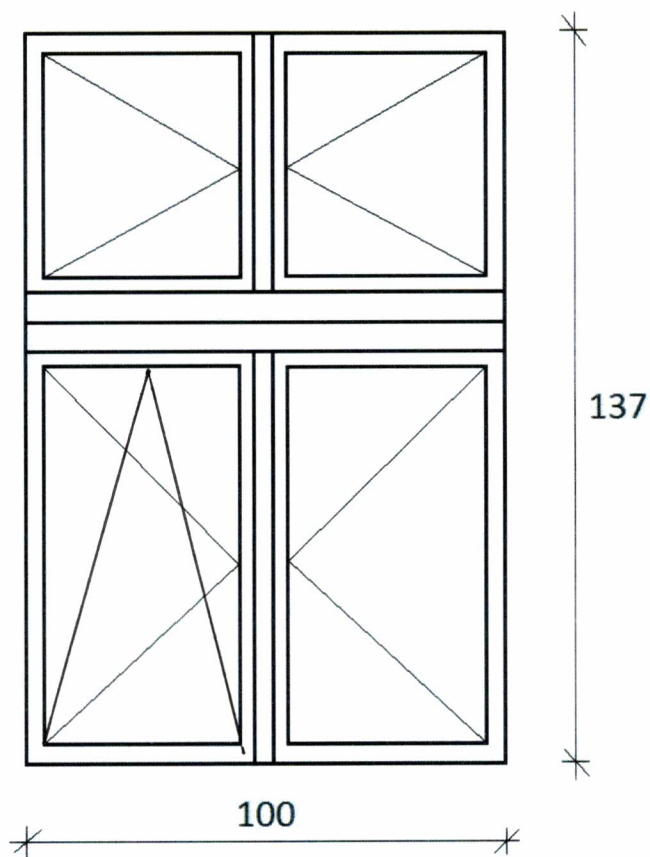


wymiary okien wg rysunku, **sztuk 2**
parapety wewnętrzne: 28x120 cm

rysunek sporządziła: Anna Romanowska

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.5*3	m m	4.500	
				RAZEM	4.500
2	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł doliczyć podokienniki z pcv 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1.45*1.45*3	m ² m ²	6.308	
				RAZEM	6.308
4	analiza indywidualna	montaż nawiewnika higrosterowalnego 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.6	m ³ m ³	0.600	
				RAZEM	0.600

Inspekcja Nadzoru
Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Świdzińska 10
20-005/32

Szkic okien Kasprzaka 4/66

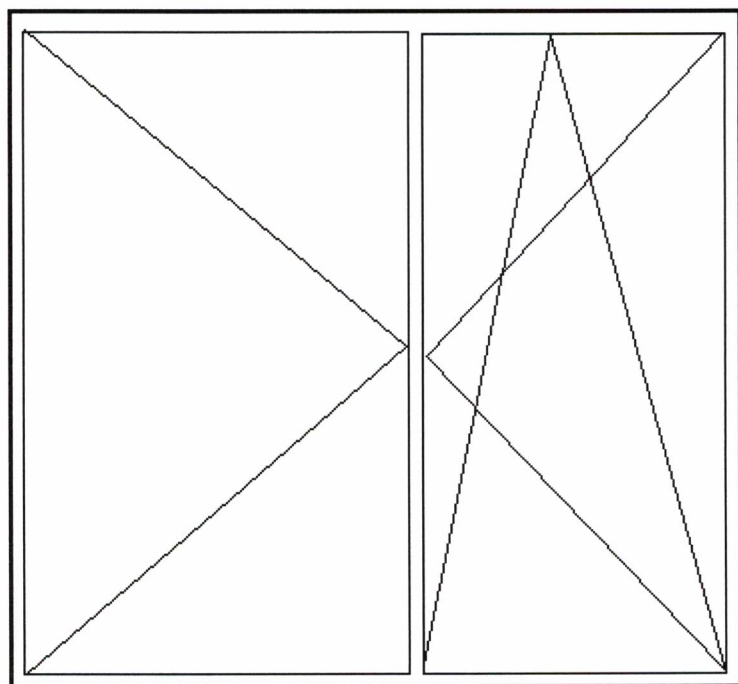

1,45

1,45

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, 1.45*1.75	m m	2.538	
				RAZEM	2.538
2	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 1.45*1.75	m ² m ²	2.538	
				RAZEM	2.538
3	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	analiza indywidualna	Nawiewnik higrosterowalny 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 1204-07	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton (1.45*2+1.75)*0.2	m ² m ²	0.930	
				RAZEM	0.930
6	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1.45*2+1.75	m m	4.650	
				RAZEM	4.650
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.3	m ³ m ³	0.300	
				RAZEM	0.300

Inspektor Nadzoru
Lubek Saganowski
 ul. Piłsudskiego 10
 72-101 WBP NB 7210/205/82

Szkic okna Kruczkowskiego 1/3 w Bydgoszczy

