


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.85*1.35*2	m ² m ²	4.995	
				RAZEM	4.995
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.35*2	m m	2.700	
				RAZEM	2.700
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 ze śłemeniem 1.85*1.35*2	m ² m ²	4.995	
				RAZEM	4.995
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.35*2	m m	2.700	
				RAZEM	2.700
6	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1.85*8+1.35*4)*0.20	m ² m ²	4.040	
				RAZEM	4.040
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4.040	m ² m ²	4.040	
				RAZEM	4.040
9	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500



Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas
upr. bud. UAN-KZ-7210/120/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0904/01

Babia Wieś 10/5



185

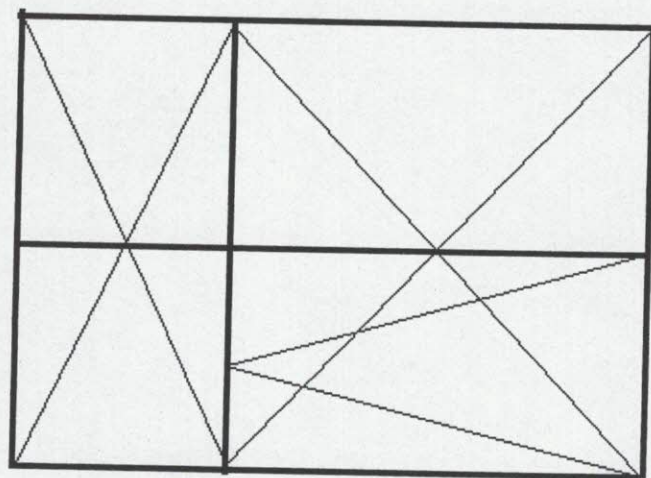

x 2



135


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Tadeusz Kalas
upr. bud. UAN/KP/12.10/120/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0904/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.45*1.35	m ²		
			m ²	1.958	
				RAZEM	1.958
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.35	m		
			m	1.350	
				RAZEM	1.350
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² 1.45*1.35	m ²		
			m ²	1.958	
				RAZEM	1.958
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.35	m		
			m	1.350	
				RAZEM	1.350
6	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1.45*4+1.35*2)*0.2	m ²		
			m ²	1.700	
				RAZEM	1.700
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.70	m ²		
			m ²	1.700	
				RAZEM	1.700
9	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas
 upr. bud. UAN-KZ-7210/120/90
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUR/BQ/0904/01

Babia Wieś 10-OF1/10

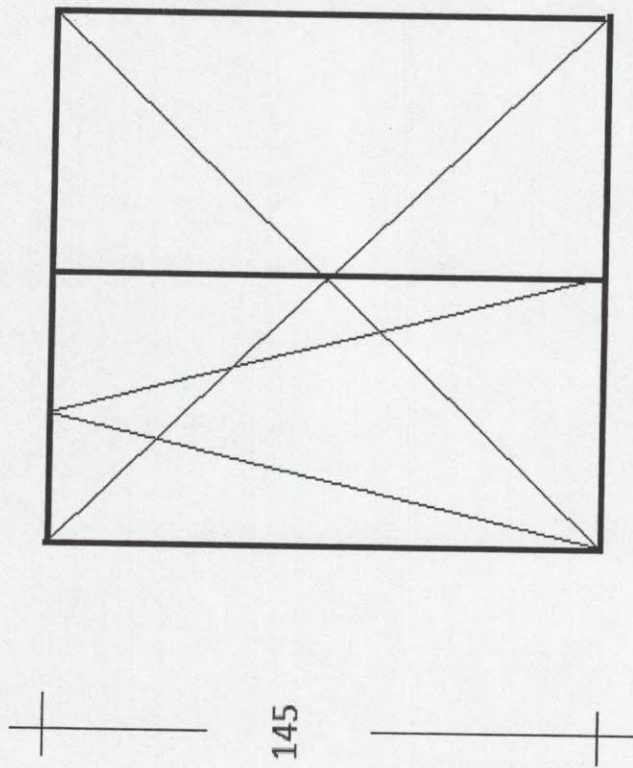



Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
~~Tadeusz Kalas~~
upr. bud. VAW/7210/120/90
w specjalności kierownictwo-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0904/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.60*1.60*2	m ²		
			m ²	5.120	
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.60*2	m		
			m	3.200	
				RAZEM	5.120
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1.60*1.60*2	m ²		
			m ²	5.120	
				RAZEM	3.200
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekaniej 1.60*2	m		
			m	3.200	
				RAZEM	3.200
6	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1.60*12*0.2	m ²		
			m ²	3.840	
				RAZEM	3.840
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.840	m ²		
			m ²	3.840	
				RAZEM	3.840
9	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas
 upr. bud. UAN-KZ 7210/120/90
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/0904/01

Babia Wieś 24/7

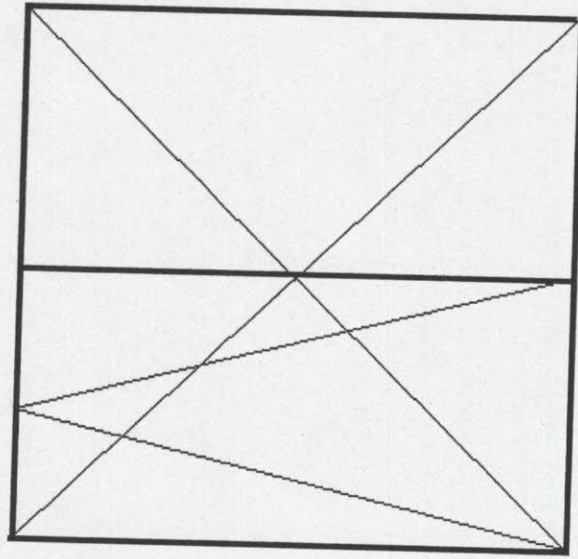

x2



Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
~~Tudek~~ ~~Kalas~~
upr. bud. UAM, KZ-7210/120/90
w specjalności: ~~projektowanie~~ ~~cyfrowo-budowlanej~~
w zakresie ~~ogólnobudowlanym~~
KUP/509904/01


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.45*1.45+1.40*1.15+1.20*1.50+1.40*1.50+0.90*2.30	m ² m ²	 9.683	 9.683
				RAZEM	9.683
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.45+0.90+1.15+1.20+1.40	m m	 6.100	 6.100
				RAZEM	6.100
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² 1.45*1.45+1.40*1.15+1.50*1.20+1.50*1.40	m ² m ²	 7.613	 7.613
				RAZEM	7.613
4	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV 2.30*0.90	m ² m ²	 2.070	 2.070
				RAZEM	2.070
5	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
6	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekananej 1.45+0.90+1.15+1.20+1.40	m m	 6.100	 6.100
				RAZEM	6.100
7	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1.45*6+2.30*2+0.90*2+1.50*8+1.15*2+1.20*2+1.40*2)*0.20	m ² m ²	 6.920	 6.920
				RAZEM	6.920
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 6.920	m ² m ²	 6.920	 6.920
				RAZEM	6.920
10	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500
12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego


Tadeusz Kalas
 upr. bud. UAMWZ-7210/120/90
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/0904/01

Baczyńskiego 21BAO/22


150

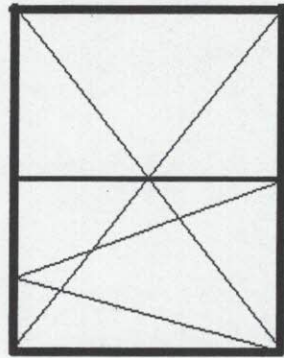

140

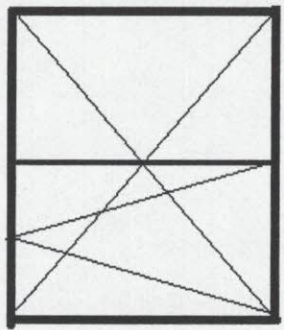

145

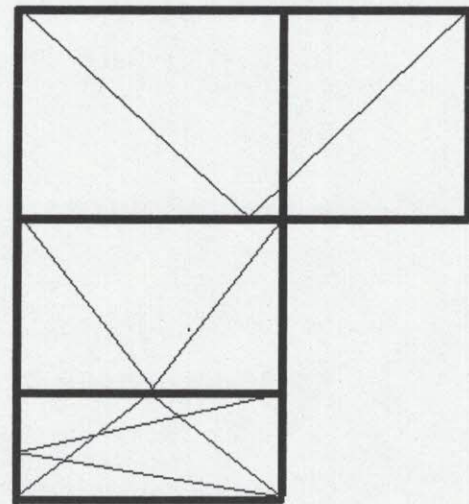

230


120

115

90

145

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
~~Tadeusz Kalas~~
upr. bud. DANKA 210/120/90
w specjalności Konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0904/01

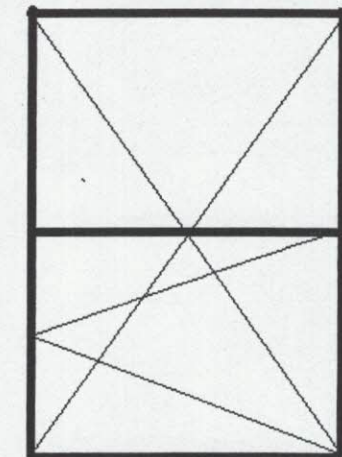

150



140

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.47*1.47*3	m ² m ²	6.483	
				RAZEM	6.483
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.47*3	m m	4.410	
				RAZEM	4.410
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² 1.47*1.47*3	m ² m ²	6.483	
				RAZEM	6.483
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.47*3	m m	4.410	
				RAZEM	4.410
6	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1.47*16*0.2	m ² m ²	4.704	
				RAZEM	4.704
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4.704	m ² m ²	4.704	
				RAZEM	4.704
9	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km - 20 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas
 upr. bud. UAN-KZ-7210/120/90
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUM/BO/0904/01

Białogardzka 14/17

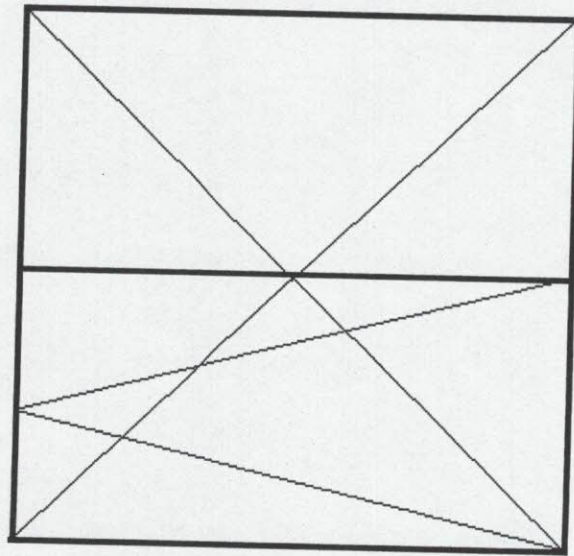

x 3



Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
~~Tadeusz Kolas~~
upr. bud. UAN/KZ/10/120/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0904/01


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.50*1.40	m ²		
			m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.40	m		
			m	1.400	
				RAZEM	1.400
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1.50*1.40*2	m ²		
			m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.40*2	m		
			m	2.800	
				RAZEM	2.800
6	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1.40*12*0.2	m ²		
			m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.360	m ²		
			m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
9	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas
 upr. bud. UAN/KZ/7210/120/90
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/0904/01

Białogardzka 14/56

150

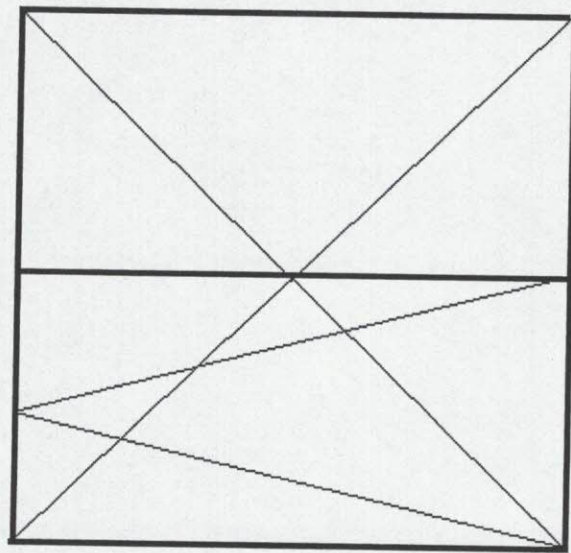

x 2

140


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
~~Tadeusz Kalas~~
upr. bud. UAN/KW/1210/120/90
w specjalności: Kierownictwo budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0904/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.20*1.0*2	m ²		
			m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.0*2	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² 1.20*1.10*2	m ²		
			m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.0*2	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
6	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1.0*12*0.2	m ²		
			m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2.40	m ²		
			m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
9	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas
 upr. bud. UAN/KZ-7210/120/90
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/0904/01


Glinki 147-27-1



120

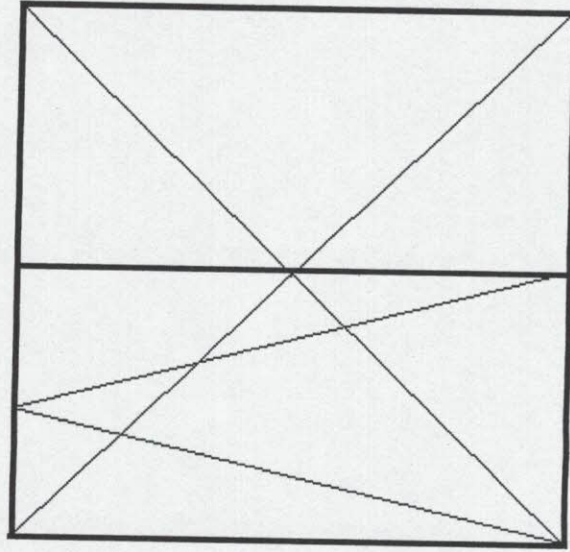

x 2



100


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
~~Tadeusz Kalas~~
upr. bud. UAW-KZ/1210/120/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUR/BO/0904/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2.00*1.20*3	m ²		
			m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.20*3	m		
			m	3.600	
				RAZEM	3.600
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 ze ślimieniem 2.0*1.20*3	m ²		
			m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.20*3	m		
			m	3.600	
				RAZEM	3.600
6	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2.0*12+1.20*6)*0.20	m ²		
			m ²	6.240	
				RAZEM	6.240
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 6.240	m ²		
			m ²	6.240	
				RAZEM	6.240
9	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas
 upr. bud. UAN-100/210/120/90
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/0904/01


Karpacka 25/2



200

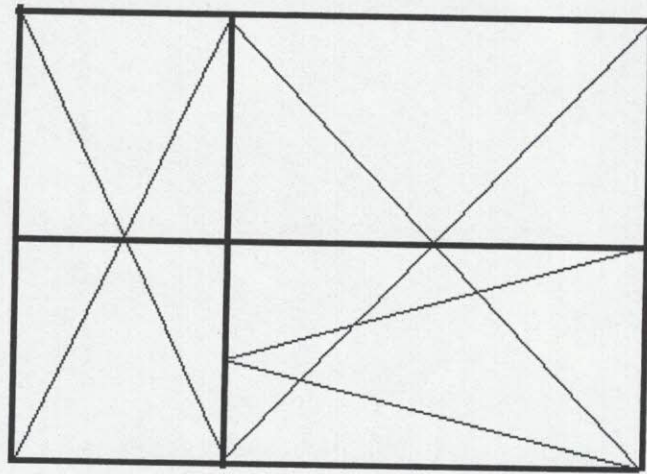

x3



120

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

~~Tadeusz Malas~~

upr. bud. UAN-KZ 101/20/90

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

w zakresie ogólnobudowlanym

KUP/BO/0904/01


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.90*1.10*3	m ²		
			m ²	6.270	
				RAZEM	6.270
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.10*3	m		
			m	3.300	
				RAZEM	3.300
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 ze ślaniem 1.90*1.10*3	m ²		
			m ²	6.270	
				RAZEM	6.270
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekaniej 1.10*3	m		
			m	3.300	
				RAZEM	3.300
6	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1.90*12+1.10*6)*0.20	m ²		
			m ²	5.880	
				RAZEM	5.880
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 5.880	m ²		
			m ²	5.880	
				RAZEM	5.880
9	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas
 upr. bud. UAN-KB-7210/120/90
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/0904/01

Karpacka 29/1

190

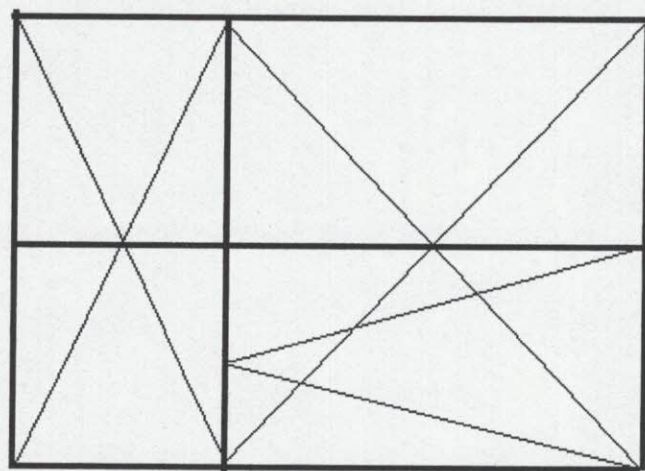

x3

110



Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Tadeusz Kalas
upr. bud. WAN/KZ/72/10/120/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0904/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.73*1.50*2	m ² m ²	5.190	
				RAZEM	5.190
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.50*2	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² ze ślaniem 1.73*1.50*2	m ² m ²	5.190	
				RAZEM	5.190
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.50*2	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
6	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1.73*8+1.50*4)*0.20	m ² m ²	3.968	
				RAZEM	3.968
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.968	m ² m ²	3.968	
				RAZEM	3.968
9	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas
 upr. bud. UMN KZ-7210/120/90
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/0904/01

Karpacka 47/3

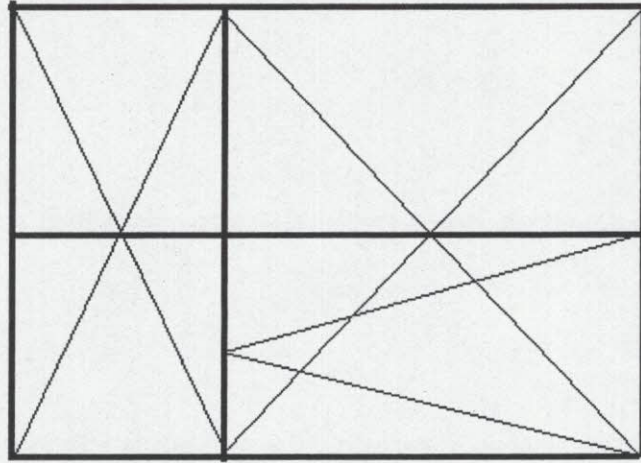

x 2



Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kubiś


upr. bud. UAN/VZ-7210/120/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
KUP/BO/0904/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.94*1.73+1.32*1.73	m ² m ²	5.640	
				RAZEM	5.640
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.94+1.32	m m	3.260	
				RAZEM	3.260
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² 1.94*1.73+1.32*1.73	m ² m ²	5.640	
				RAZEM	5.640
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.94+1.32	m m	3.260	
				RAZEM	3.260
6	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1.94*2+1.32*2+1.73*8)*0.2	m ² m ²	4.072	
				RAZEM	4.072
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4.072	m ² m ²	4.072	
				RAZEM	4.072
9	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas
upr. bud. UAN/K-7210/120/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0904/01

Kliniczna 1/1

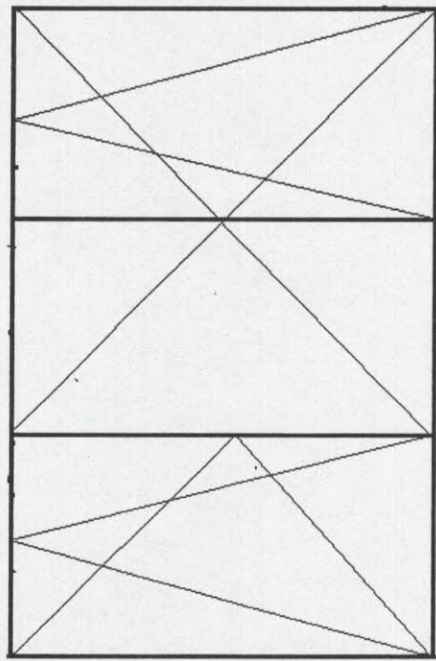

194

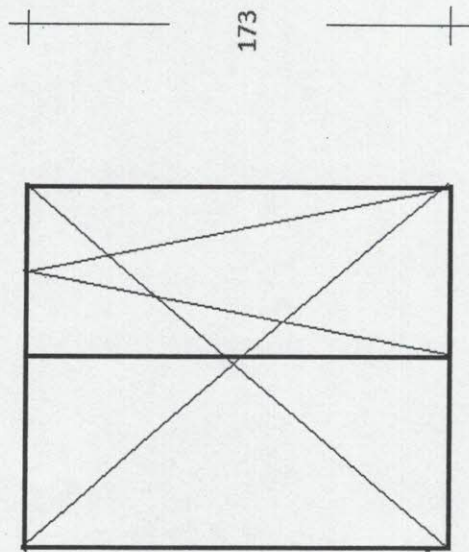

173

132


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Tadeusz Kalas
upr. bud. UAN KZ-7210/120/90
w specjalności kosztorysowo-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUR/50/0904/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.50*1.45*2	m ² m ²	 4.350	
				RAZEM	4.350
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.45*2	m m	 2.900	
				RAZEM	2.900
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² 1.50*1.45*2	m ² m ²	 4.350	
				RAZEM	4.350
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.45*2	m m	 2.900	
				RAZEM	2.900
6	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1.50*8+1.35*4)*0.2	m ² m ²	 3.480	
				RAZEM	3.480
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.480	m ² m ²	 3.480	
				RAZEM	3.480
9	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas
upr. bud. UAN KZ-7210/120/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0904/01


Mokra 13/2



150

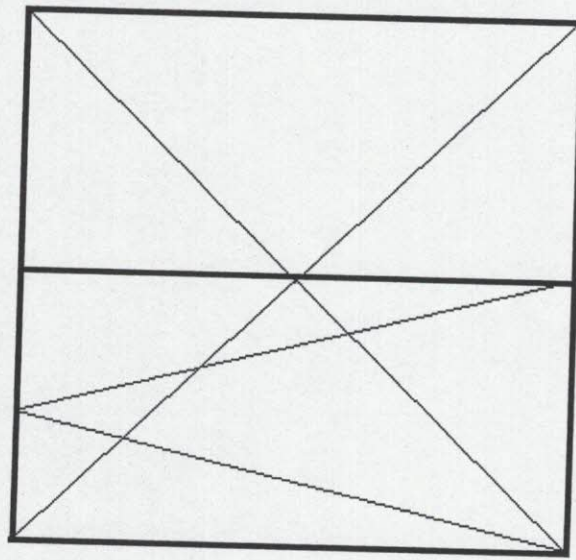

x2



145


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Tadeusz Holas
upr. bud. UAN-KZ/BO/120/90
w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0904/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 2.10*1.45+1.90*1.45	m ²		
			m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 2.10+1.90	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² 2.10*1.45+1.90*1.45	m ²		
			m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 2.10+1.90	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
6	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2.10*2+1.90*2+1.45*8)*0.2	m ²		
			m ²	3.920	
				RAZEM	3.920
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.920	m ²		
			m ²	3.920	
				RAZEM	3.920
9	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas
 upr. bud. UAN-KZ/7210/120/90
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/0904/01

Planu 6 letniego 31 AO/9

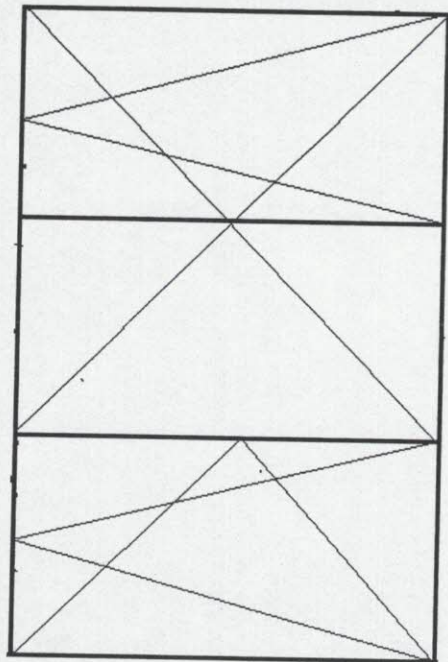

210

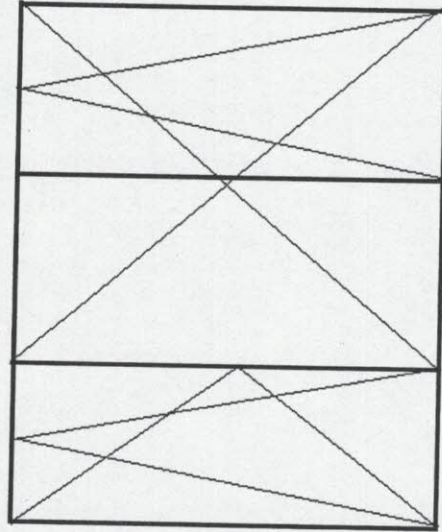

190

145



Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
~~Tadeusz Kalas~~
upr. bud. UM/KZ-7210/120/90
w specjalności Konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0904/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.47*1.47*2	m ²		
			m ²	4.322	
				RAZEM	4.322
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.47*2	m		
			m	2.940	
				RAZEM	2.940
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1.47*1.47*2	m ²		
			m ²	4.322	
				RAZEM	4.322
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.47*2	m		
			m	2.940	
				RAZEM	2.940
6	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1.47*12*0.2	m ²		
			m ²	3.528	
				RAZEM	3.528
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.528	m ²		
			m ²	3.528	
				RAZEM	3.528
9	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas
 upr. bud. UAN 62-7210/120/90
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/0904/01

Przodowników Pracy 20-AO/13

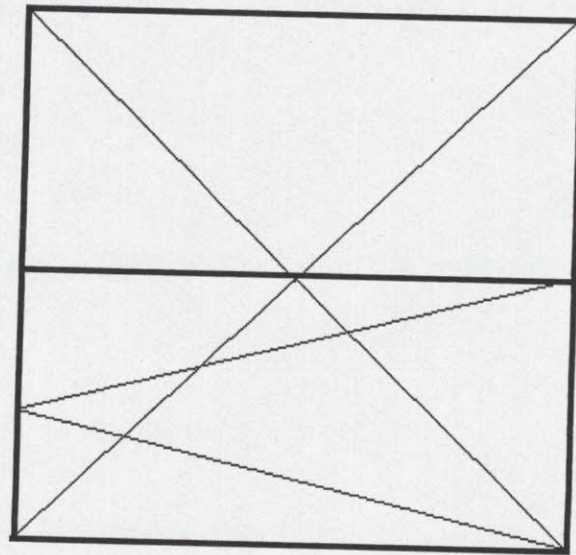

x 2




Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Tadeusz Kalas
upr. bud. / MAM / KZ-7210/120/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0904/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.50*1.50	m ² m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.50	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1.50*1.50	m ² m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.50	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
6	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1.50*6*0.20	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.80	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
9	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas
 upr. bud. UAN KZ-7210/120/90
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/0904/01

Sandomierska 37-AO/97

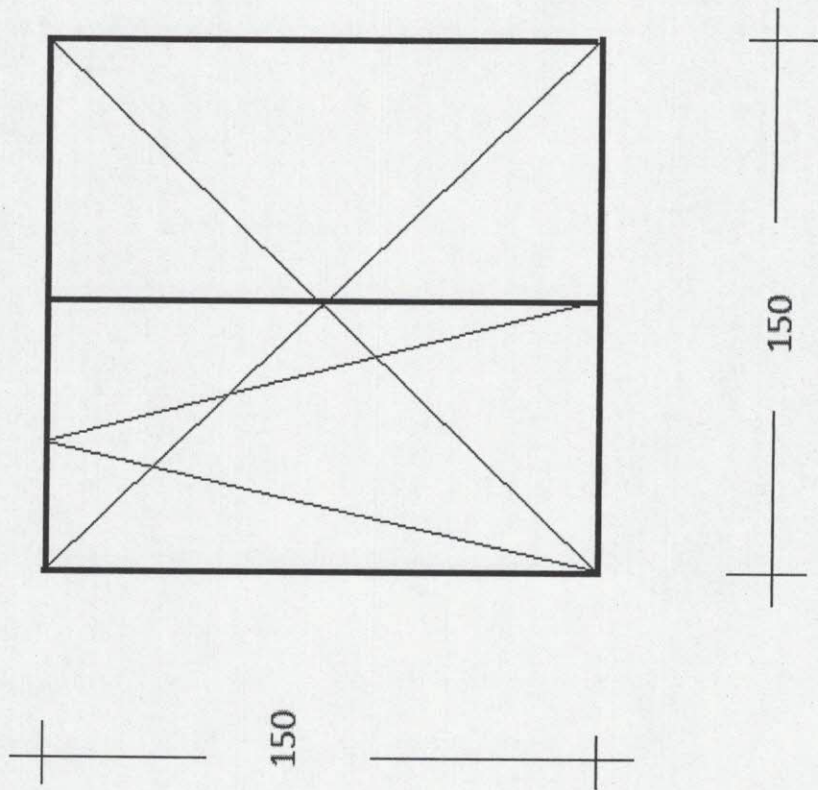


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Tadeusz Kalas
upr. bud. UAN-KZ/210/120/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnego budowlanym
KUP/50/0904/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.55*1.12*2	m ² m ²	 3.472	 3.472
				RAZEM	3.472
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.12*2	m m	 2.240	 2.240
				RAZEM	2.240
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 ze ślemieniem 1.55*1.12	m ² m ²	 1.736	 1.736
				RAZEM	1.736
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.12*2	m m	 2.240	 2.240
				RAZEM	2.240
6	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1.55*8+1.12*4)*0.20	m ² m ²	 3.376	 3.376
				RAZEM	3.376
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.376	m ² m ²	 3.376	 3.376
				RAZEM	3.376
9	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500



Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas
upr. bud. UM WZ-7210/120/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0904/01

Toruńska 123-OF2/4



x2

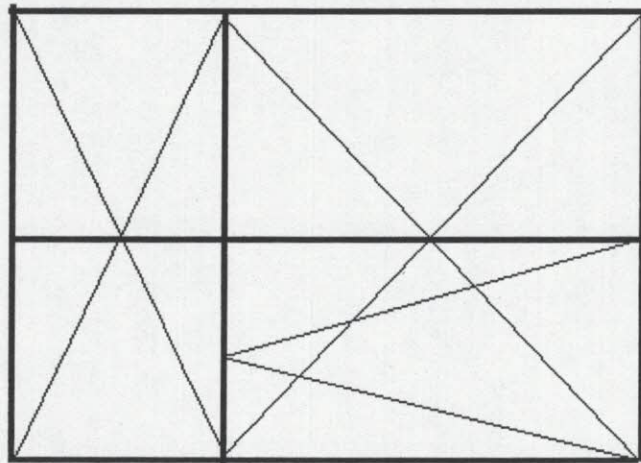


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
~~Tadeusz Kolas~~
upr. bud. UAN-KZ-210/120/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0904j01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2.30*1.30*3	m ²		
			m ²	8.970	
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.30*3	m		
			m	3.900	
				RAZEM	8.970
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 ze ślaniem 2.30*1.30*3	m ²		
			m ²	8.970	
				RAZEM	3.900
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	8.970
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.30*3	m		
			m	3.900	
				RAZEM	3.900
6	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.900
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2.30*12+1.30*6)*0.20	m ²		
			m ²	7.080	
				RAZEM	7.080
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 7.080	m ²		
			m ²	7.080	
				RAZEM	7.080
9	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas
 upr. bud. UAN-KZ-7210/120/90
 w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/0904/01


Toruńska 22-Front(GB)1



230

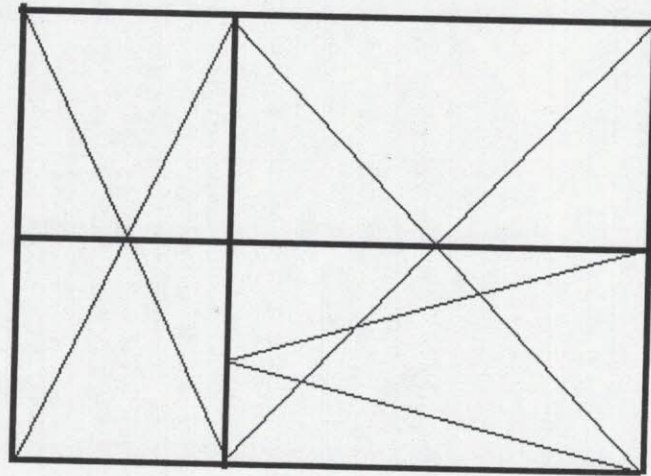

x3



130

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
~~Tadeusz Kojas~~
upr. bud. UAN-KZ/240/120/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0904/01


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.70*1.60*3	m2		
			m2	8.160	
				RAZEM	8.160
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.60*3	m		
			m	4.800	
				RAZEM	4.800
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1.70*1.60*3	m2		
			m2	8.160	
				RAZEM	8.160
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.60*3	m		
			m	4.800	
				RAZEM	4.800
6	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1.70*12+1.60*6)*0.20	m2		
			m2	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 6.0	m2		
			m2	6.000	
				RAZEM	6.000
9	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m3		
			m3	0.500	
				RAZEM	0.500
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.5	m3		
			m3	0.500	
				RAZEM	0.500

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas
 upr. bud. UAN/KZ-7210/120/90
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/0904/01

Wojska Polskiego 39/3/25

170

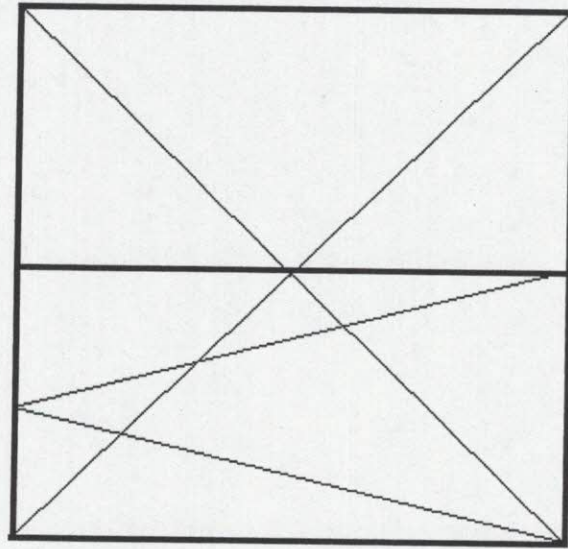

x 3

160

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
~~Tadeusz Kalas~~
upr. bud. UAM KZ 7210/120/90
w specjalności Konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0904/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.70*1.60*3	m ²		
			m ²	8.160	
				RAZEM	8.160
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.60*6	m		
			m	9.600	
				RAZEM	9.600
3	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 1.70*1.60*3	m ²		
			m ²	8.160	
				RAZEM	8.160
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.60*3	m		
			m	4.800	
				RAZEM	4.800
6	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1.70*12*0.20+1.60*6*0.20	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 6.0	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
9	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.2	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.2	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego



Tadeusz Kalas
 upr. bud. UAN/KZ-7210/120/90
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/0904/01

Wojska Polskiego 39/4/30



170

x 3

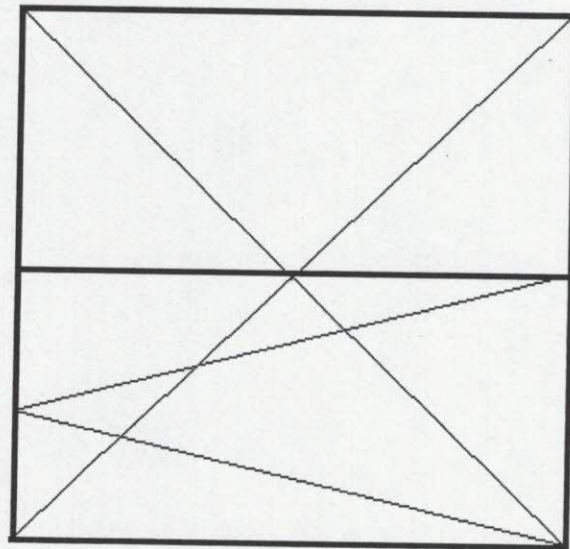

160

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

~~Tadeusz Malas~~
upr. bud. UAN-KZ/210/120/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0904/01
